ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Zhotovitel
1	**Praha-Smíchov - Černošice**	**1081 dny**	**12.08. 19**	**28.07. 22**	
2	**Praha-Smíchov (mimo) - Praha-Velká Chuchle/Závodiště**	**1022 dny**	**12.08. 19**	**30.05. 22**	
3	**P - Přípravné práce**	**220 dny**	**12.08. 19**	**19.03. 20**	
4	PS 02-22-01 - P - TM Chuchle, MK	220 dny	12.08. 19	19.03. 20	EUR/AŽD
5	PS 02-22-03 - P - Úprava DK, Smí-Rad	220 dny	12.08. 19	19.03. 20	EUR/AŽD
6	PS 02-23-02 - P - PTM Chuchle DŘT	78 dny	01.01. 20	19.03. 20	EŽ
7	PS 02-23-91 - P - PTM Chuchle, technologie	78 dny	01.01. 20	19.03. 20	EŽ
8	SO 02-35-08 - P - Úprava NN v km 4,833	78 dny	01.01. 20	19.03. 20	EUR/EL
9	SO 02-35-10 - P - PTM Chuchle, úprava VN	78 dny	01.01. 20	19.03. 20	EUR/EL
10	SO 02-51-53 - P - Oplocení, TM Chuchle	220 dny	12.08. 19	19.03. 20	STR
11	SO 02-61-01 - P - Trakční vedení, Smí-VCH	139 dny	01.11. 19	19.03. 20	EŽ
12	SO 02-61-91 - P - PTM Chuchle, připojení	78 dny	01.01. 20	19.03. 20	EŽ
13	SO 02-64-01 - P - Elektrický ohřev výměn, odbočka VCH	220 dny	12.08. 19	19.03. 20	EUR/EL
14	SO 02-66-06 - P - Základnová stanice GSM-R, MCH	220 dny	12.08. 19	19.03. 20	EUR/EL
15	SO 02-66-61 - P - Dálkové ovládání odpojovačů a návěst č.50, TM Chuchle	220 dny	12.08. 19	19.03. 20	EUR/EL
16	SO 02-68-91 - P - Uzemnění, PTM Chuchle	139 dny	01.11. 19	19.03. 20	EUR/EL
17	***SZZ odbočky Barrandov (DSPŘ + výroba + testy + instalace)***	**220 dny**	**12.08. 19**	**19.03. 20**	
18	PS 02-21-11 - P - TZZ, Smí-VCH	220 dny	12.08. 19	19.03. 20	STR/AŽD
19	PS 02-21-12 - P - TZZ, Krč-VCH	220 dny	12.08. 19	19.03. 20	STR/AŽD
20	PS 02-22-05 - P - DOK a TK, Rad-Krč	220 dny	12.08. 19	19.03. 20	EUR/AŽD
21	PS 91-22-01 - P - DOK a TK, Smí-Če	220 dny	12.08. 19	19.03. 20	EUR/AŽD
22	**Přístupy, plochy ZS, vytyčení IS**	220 dny	12.08. 19	19.03. 20	
23	***Kácení***	**147 dny**	**24.10. 19**	**19.03. 20**	
24	SO 91-71-01 - P - Odstranění mimolesní zeleně, Smí-Če	147 dny	24.10. 19	19.03. 20	EUR
25	Doplnění/pokračování PS 02-21-11	104 dny	01.04. 20	14.07. 20	STR/AŽD
26	Doplnění/pokračování PS 02-21-12	104 dny	01.04. 20	14.07. 20	STR/AŽD
27	Doplnění/pokračování PS 91-22-01 na celé stavbě	104 dny	01.04. 20	14.07. 20	EUR/AŽD
28	**Aktivace AH Praha Krč - Praha Radotín**	**14 dny**	**29.06. 20**	**13.07. 20**	
29	PS 02-21-12 - A - TZZ, Krč-VCH	14 dny	29.06. 20	13.07. 20	STR/AŽD
30	**0/0b.1 - Zřízení odbočky Barrandov 1.část**	**4 dny**	**30.04. 20**	**04.05. 20**	
31	PS 02-21-11 - 0/0b.1 - TZZ, Smí-VCH	4 dny	30.04. 20	04.05. 20	STR/AŽD
32	PS 02-22-03 - 0/0b.1 - Úprava DK, Smí-Rad	4 dny	30.04. 20	04.05. 20	EUR/AŽD
33	***Vložení výhybek PX1, PX4 a dočasného přejezdu v km 4,810 (konstrukce)***	**4 dny**	**30.04. 20**	**04.05. 20**	
34	SO 02-31-01 - 0/0b.1 - Žel. svršek, kol. č.1, Smí-VCH	4 dny	30.04. 20	04.05. 20	STR
35	SO 02-31-02 - 0/0b.1 - Žel. svršek, kol. č.2, Smí-VCH	4 dny	30.04. 20	04.05. 20	GJW
36	SO 02-31-11 - 0/0b.1 - Žel. spodek, kol. č.1, Smí-VCH	4 dny	30.04. 20	04.05. 20	EUR
37	SO 02-31-12 - 0/0b.1 - Žel. spodek, kol. č.2, Smí-VCH	4 dny	30.04. 20	04.05. 20	EUR
38	SO 91-31-51 - 0/0b.1 - Výstroj a značení trati, Smí-Če	4 dny	30.04. 20	04.05. 20	STR
39	***Dočasný přejezd v km 4,810 (Zbraslavská): vložení konstrukce***	**4 dny**	**30.04. 20**	**04.05. 20**	
40	SO 02-31-11 - 0/0b.1 - Žel. spodek, kol. č.1, Smí-VCH	4 dny	30.04. 20	04.05. 20	EUR
41	SO 02-31-12 - 0/0b.1 - Žel. spodek, kol. č.2, Smí-VCH	4 dny	30.04. 20	04.05. 20	EUR
42	**0/0b.2 - Zřízení odbočky Barrandov 2.část**	**4 dny**	**07.05. 20**	**11.05. 20**	
43	PS 02-21-11 - 0/0b.2 - TZZ, Smí-VCH	4 dny	07.05. 20	11.05. 20	STR/AŽD
44	PS 02-22-03 - 0/0b.2 - Úprava DK, Smí-Rad	4 dny	07.05. 20	11.05. 20	EUR/AŽD
45	**Vložení výhybek PX2, PX3 a dočasného přejezdu v km 4,810 (konstrukce)**	**4 dny**	**07.05. 20**	**11.05. 20**	
46	SO 02-31-01 - 0/0b.2 - Žel. svršek, kol. č.1, Smí-VCH	4 dny	07.05. 20	11.05. 20	STR
47	SO 02-31-02 - 0/0b.2 - Žel. svršek, kol. č.2, Smí-VCH	4 dny	07.05. 20	11.05. 20	GJW
48	SO 02-31-11 - 0/0b.2 - Žel. spodek, kol. č.1, Smí-VCH	4 dny	07.05. 20	11.05. 20	EUR
49	SO 02-31-12 - 0/0b.2 - Žel. spodek, kol. č.2, Smí-VCH	4 dny	07.05. 20	11.05. 20	EUR
50	SO 91-31-51 - 0/0b.2 - Výstroj a značení trati, Smí-Če	4 dny	07.05. 20	11.05. 20	STR
51	**Zatrolejování spojek PX1-2 a PX3-4**	4 dny	18.05. 20	22.05. 20	EŽ
52	**Aktivace SZZ odbočky Barrandov**	**0 dny**	**14.07. 20**	**14.07. 20**	
53	PS 02-21-11-0/0b.2 - TZZ, Smí-VCH	0 dny	14.07. 20	14.07. 20	STR/AŽD
54	**1 - Přeložka koleje 1 v úseku km cca 5,8 - 6,2**	**34 dny**	**16.07. 20**	**19.08. 20**	
55	PS 02-21-01 - 1 - SZZ, VCH	34 dny	16.07. 20	19.08. 20	STR/AŽD
56	PS 02-21-11 - 1 - TZZ, Smí-VCH	34 dny	16.07. 20	19.08. 20	STR/AŽD
57	PS 02-22-03 - 1 - Úprava DK, Smí-Rad	34 dny	16.07. 20	19.08. 20	EUR/AŽD
58	SO 02-66-06 - 1 - Základnová stanice GSM-R, MCH	34 dny	16.07. 20	19.08. 20	EUR/EL
59	***Demontáž svršku a TV koleje 1 v úseku km cca 5,8 - 6,2***	**4 dny**	**16.07. 20**	**20.07. 20**	
60	SO 02-31-01 - 1 - Žel. svršek, kol. č.1, Smí-VCH	4 dny	16.07. 20	20.07. 20	STR
61	SO 02-61-01 - 1 - Trakční vedení, Smí-VCH	4 dny	16.07. 20	20.07. 20	EŽ
62	SO 91-31-51 - 1 - Výstroj a značení trati, Smí-Če	4 dny	16.07. 20	20.07. 20	STR
63	***Spodek, svršek a TV koleje 1 v úseku km cca 5,8 - 6,2***	**30 dny**	**20.07. 20**	**19.08. 20**	
64	SO 02-31-01 - 1 - Žel. svršek, kol. č.1, Smí-VCH	30 dny	20.07. 20	19.08. 20	STR
65	SO 02-31-11 - 1 - Žel. spodek, kol. č.1, Smí-VCH	30 dny	20.07. 20	19.08. 20	EUR
66	SO 02-61-01 - 1 - Trakční vedení, Smí-VCH	30 dny	20.07. 20	19.08. 20	EŽ
67	SO 02-67-01 - 1 - Ukolejnění, Smí-VCH	30 dny	20.07. 20	19.08. 20	EŽ
68	SO 91-31-51 - 1 - Výstroj a značení trati, Smí-Če	30 dny	20.07. 20	19.08. 20	STR
69	SO 02-35-01 - Úprava NN v km 2,965	222 dny	01.01. 20	10.08. 20	EUR/EL
70	SO 02-35-02 - Úprava VN v km 3,201	222 dny	01.01. 20	10.08. 20	EUR/EL
71	SO 02-35-03 - Úprava NN v km 3,201	222 dny	01.01. 20	10.08. 20	EUR/EL
72	SO 02-35-04 - Úprava VO v km 3,204	222 dny	01.01. 20	10.08. 20	EUR/EL
73	SO 02-55-01 - Demolice objektu, Smí-Rad	156 dny	15.07. 20	18.12. 20	EUR
74	SO 02-51-01 - Stavební úpravy TM Chuchle	219 dny	01.07. 20	01.04. 21	STR
75	technologická přestávka	59 dny	23.06. 20	21.08. 20	
76	**2/2a - Rekonstrukce koleje 2 Praha-Smíchov-Barrandov**	**59 dny**	**22.08. 20**	**20.10. 20**	
77	PS 02-21-11 - 2/2a - TZZ, Smí-VCH	59 dny	22.08. 20	20.10. 20	STR/AŽD
78	PS 02-22-03 - 2/2a - Úprava DK, Smí-Rad	59 dny	22.08. 20	20.10. 20	EUR/AŽD
79	SO 02-31-12 - 2/2a - Žel. spodek, kol. č.2, Smí-VCH	49 dny	27.08. 20	15.10. 20	EUR
80	***Demontáž svršku a trakce koleje 2 P-Smíchov - Barrandov***	**4 dny**	**22.08. 20**	**26.08. 20**	
81	SO 02-31-02 - 2/2a - Žel. svršek, kol.č.2, Smí-VCH	4 dny	22.08. 20	26.08. 20	GJW
82	SO 02-61-01 - 2/2a - Trakční vedení, Smí-VCH	4 dny	22.08. 20	26.08. 20	EŽ
83	SO 91-31-51 - 2/2a - Výstroj a značení trati, Smí-Če	4 dny	22.08. 20	26.08. 20	STR
84	***Rekonstrukce mostu v km 2,610, sudá část***	**49 dny**	**27.08. 20**	**15.10. 20**	
85	SO 02-34-01 - 2/2a - Most v km 2,610	49 dny	27.08. 20	15.10. 20	STR/MTS
86	***Základy TV + podpěry TV koleje 2 P-Smíchov - Barrandov***	**29 dny**	**11.09. 20**	**10.10. 20**	
87	SO 02-61-01 - 2/2a - Trakční vedení, Smí-VCH	29 dny	11.09. 20	10.10. 20	EŽ
88	***Svršek + trakce koleje 2 P-Smíchov - Barrandov***	**4 dny**	**16.10. 20**	**20.10. 20**	
89	SO 02-31-02 - 2/2a - Žel. svršek, kol.č.2, Smí-VCH	4 dny	16.10. 20	20.10. 20	GJW
90	SO 02-61-01 - 2/2a - Trakční vedení, Smí-VCH	4 dny	16.10. 20	20.10. 20	EŽ
91	SO 02-67-01 - 2/2a - Ukolejnění, Smí-VCH	4 dny	16.10. 20	20.10. 20	EŽ
92	SO 91-31-51 - 2/2a - Výstroj a značení trati, Smí-Če	4 dny	16.10. 20	20.10. 20	STR
93	**2/2b - Rekonstrukce koleje 1 Praha-Smíchov-Barrandov**	**58 dny**	**21.10. 20**	**18.12. 20**	
94	PS 02-21-11 - 2/2b - TZZ, Smí-VCH	58 dny	21.10. 20	18.12. 20	STR/AŽD
95	PS 02-22-03 - 2/2b - Úprava DK, Smí-Rad	58 dny	21.10. 20	18.12. 20	EUR/AŽD
96	PS 91-22-01 - 2/2b - DOK a TK, Smí-Če	58 dny	21.10. 20	18.12. 20	EUR/AŽD
97	SO 02-31-11 - 2/2b - Žel. spodek, kol. č.1, Smí-VCH	49 dny	26.10. 20	14.12. 20	EUR
98	SO 91-61-51 - 2/2b - Převěšení závěsného optického kabelu SŽDC, Smí-Če	58 dny	21.10. 20	18.12. 20	EŽ
99	***Demontáž svršku a trakce koleje 1 P-Smíchov - Barrandov***	**4 dny**	**21.10. 20**	**25.10. 20**	
100	SO 02-31-01 - 2/2b - Žel. svršek, kol.č.1, Smí-VCH	4 dny	21.10. 20	25.10. 20	STR
101	SO 02-61-01 - 2/2b - Trakční vedení, Smí-VCH	4 dny	21.10. 20	25.10. 20	EŽ
102	SO 91-31-51 - 2/2b - Výstroj a značení trati, Smí-Če	4 dny	21.10. 20	25.10. 20	STR
103	***Rekonstrukce mostu v km 2,610, lichá část***	**49 dny**	**26.10. 20**	**14.12. 20**	
104	SO 02-34-01 - 2/2b - Žel. most v km 2,610	49 dny	26.10. 20	14.12. 20	STR/MTS
105	***Základy TV + podpěry TV koleje 1 P-Smíchov - Barrandov***	**29 dny**	**26.10. 20**	**24.11. 20**	
106	SO 02-61-01 - 2/2b - Trakční vedení, Smí-VCH	29 dny	26.10. 20	24.11. 20	EŽ
107	***Svršek + trakce koleje 1 P-Smíchov - Barrandov***	**3 dny**	**15.12. 20**	**18.12. 20**	
108	SO 02-31-01 - 2/2b - Žel. svršek, kol.č.1, Smí-VCH	3 dny	15.12. 20	18.12. 20	STR
109	SO 02-61-01 - 2/2b - Trakční vedení, Smí-VCH	3 dny	15.12. 20	18.12. 20	EŽ
110	SO 02-67-01 - 2/2b - Ukolejnění, Smí-VCH	3 dny	15.12. 20	18.12. 20	EŽ
111	SO 91-31-51 - 2/2b - Výstroj a značení trati, Smí-Če	3 dny	15.12. 20	18.12. 20	STR
112	SO 02-35-09 - Úprava rozvodu VN 22 kV PREDI, napojení, TM Chuchle	445 dny	01.01. 20	21.03. 21	EUR/EL
113	SO 02-35-23 - Úpravy a ochrana sdělovacích kabelů PREdi	616 dny	01.01. 20	08.09. 21	EUR/EL
114	SO 02-36-61 - Přeložka plynovodu v km 4,719	445 dny	01.01. 20	21.03. 21	EUR
115	zimní přestávka	92 dny	19.12. 20	21.03. 21	
116	**3/3b - Rekonstrukce koleje 2 Barrandov - Závodiště**	**170 dny**	**22.03. 21**	**08.09. 21**	

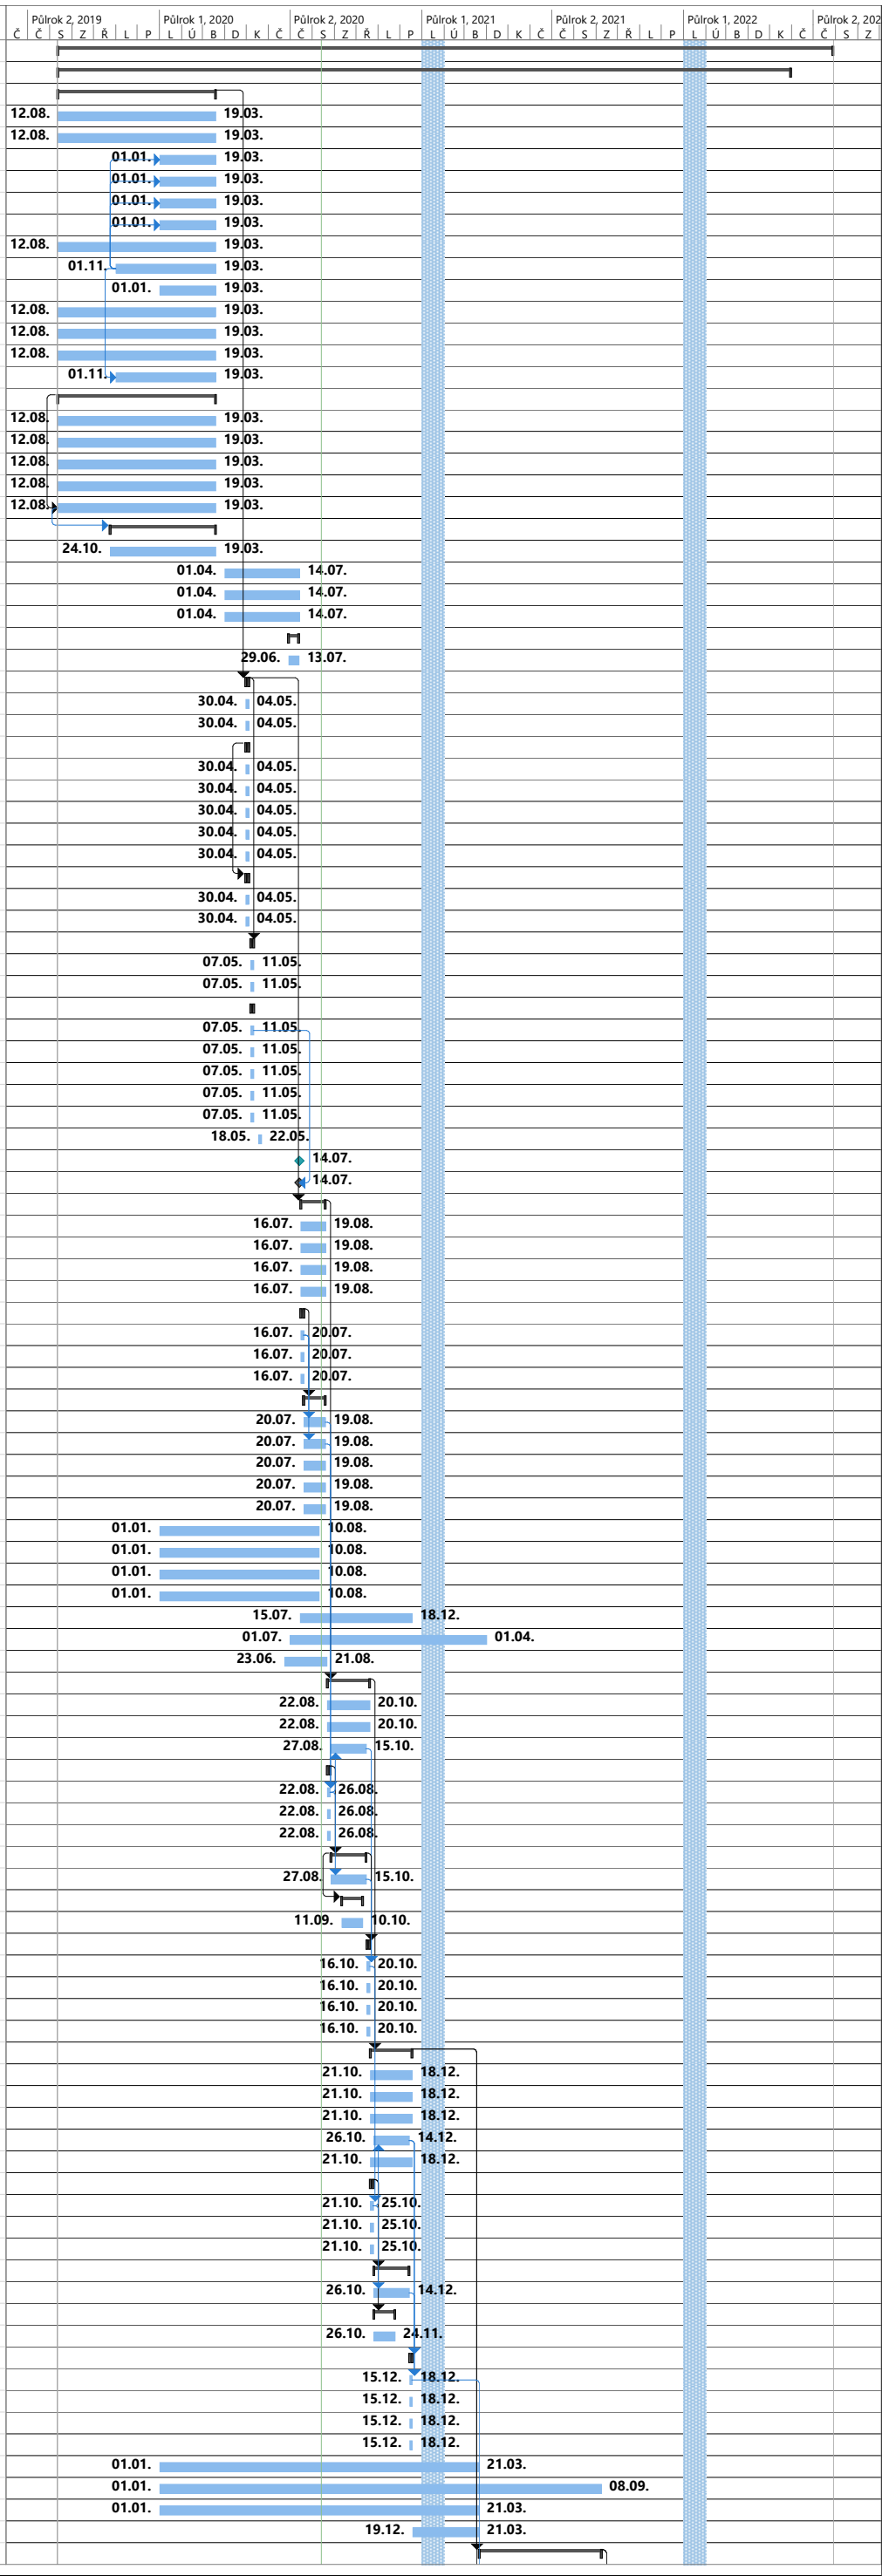

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Zhotovitel
117	Uzavírka ulice Podjezd (objížďka přes dočasný přejezd km 4,810)	89 dny	15.05. 21	12.08. 21	
118	PS 02-21-11 - 3/3b - TZZ, Smí-VCH	170 dny	22.03. 21	08.09. 21	STR/AŽD
119	PS 02-22-01 - 3/3b - MK, TM Chuchle	170 dny	22.03. 21	08.09. 21	EUR/AŽD
120	PS 02-22-12 - 3/3b - Sdělovací zařízení, TM Chuchle	170 dny	22.03. 21	08.09. 21	EUR/AŽD
121	PS 02-22-11 - 3/3b - EZS, TM Chuchle	170 dny	22.03. 21	08.09. 21	EUR/AŽD
122	PS 02-22-21 - 3/3b - Kamerový systém TM Chuchle	170 dny	22.03. 21	08.09. 21	EUR/AŽD
123	PS 02-22-03 - 3/3b - Úprava stávajích DK, Smí-Rad	170 dny	22.03. 21	08.09. 21	EUR/AŽD
124	PS 91-22-02 - 3/3b - Přenosový systém, Smí-Če	170 dny	22.03. 21	08.09. 21	EUR/AŽD
125	PS 02-23-01 - 3/3b - DŘT, TM Chuchle	170 dny	22.03. 21	08.09. 21	EŽ
126	PS 02-23-21 - 3/3b - Rozvodna 22 kV, technologie TM Chuchle	170 dny	22.03. 21	08.09. 21	EŽ
127	PS 02-23-22 - 3/3b - Trakční transformátory, TM Chuchle	170 dny	22.03. 21	08.09. 21	EŽ
128	PS 02-23-23 - 3/3b - Stejnosměrná část 3 kV-DC, TM Chuchle	170 dny	22.03. 21	08.09. 21	EŽ
129	PS 02-23-24 - 3/3b - Vlastní spotřeba, TM Chuchle	170 dny	22.03. 21	08.09. 21	EŽ
130	PS 02-23-26 - 3/3b - Vazba napáječů, TM Chuchle	170 dny	22.03. 21	08.09. 21	EŽ
131	PS 02-23-91 - 3/3b - Technologie, PTM Chuchle	10 dny	29.08. 21	08.09. 21	EŽ
132	PS 02-23-51 - 3/3b - Transformovna 22/6 kV, 50 Hz, TM Chuchle	170 dny	22.03. 21	08.09. 21	EŽ
133	PS 92-23-01 - 3/3b - Doplnění DŘT, ED Křenovka	170 dny	22.03. 21	08.09. 21	EŽ
134	SO 02-31-12 - 3/3b - Žel. spodek, kol.č.2, Smí-VCH	138 dny	27.03. 21	12.08. 21	EUR
135	SO 02-35-05 - 3/3b - Úprava rozvodu VN 22 kV PŘEDI, most v km 4,680	14 dny	15.05. 21	29.05. 21	EUR/EL
136	SO 02-35-06 - 3/3b - Úprava rozvodu NN 0,4 kV PREDI, most v km 4,680	14 dny	15.05. 21	29.05. 21	EUR/EL
137	SO 02-35-07 - 3/3b - Úprava veřejného osvětlení, most v km 4,680	14 dny	15.05. 21	29.05. 21	EUR/EL
138	SO 02-35-09 - 3/3b - Úprava rozvodu VN 22 kV PREDI, napojení, TM Chuchle	170 dny	22.03. 21	08.09. 21	EUR/EL
139	SO 02-35-23 - 3/3b - Úprava sdělovacích kabelů PREDI, Smí-Rad	14 dny	15.05. 21	29.05. 21	EUR/EL
140	SO 02-40-51 - 3/3b - PHS, MCH - Ulice Zbraslavská	170 dny	22.03. 21	08.09. 21	EUR
141	SO 02-61-61 - 3/3b - Připojení napájecího vedení, TM Chuchle	170 dny	22.03. 21	08.09. 21	EŽ
142	SO 02-61-62 - 3/3b - Připojení zpětného vedení, TM Chuchle	170 dny	22.03. 21	08.09. 21	EŽ
143	SO 02-64-01 - 3/3b - Elektrický ohřev výměn, odbočka VCH	170 dny	22.03. 21	08.09. 21	EUR/EL
144	SO 02-66-01 - 3/3b - Rozvod NN, osvětlení, TM Chuchle	170 dny	22.03. 21	08.09. 21	EUR/EL
145	SO 02-66-21 - 3/3b - Úprava rozvodu VN 6 kV 50 Hz, napojení, TM Chuchle	170 dny	22.03. 21	08.09. 21	EUR/EL
146	SO 02-66-61 - 3/3b - Dálkové ovládání odpojovačů a návěst č.50, TM Chuchle	170 dny	22.03. 21	08.09. 21	EUR/EL
147	SO 02-66-62 - 3/3b - Dálkové ovládání odpojovačů, odbočka VCH	170 dny	22.03. 21	08.09. 21	EUR/EL
148	SO 02-68-01 - 3/3b - Vnější uzemnění, TM Chuchle	170 dny	22.03. 21	08.09. 21	EUR/EL
149	***Demontáž svršku a trakce koleje 2 odbočka Barrandov - Velká Chuchle***	**4 dny**	**22.03. 21**	**26.03. 21**	
150	SO 02-31-02 - 3/3b - Žel. svršek, kol.č.2, Smí-VCH	4 dny	22.03. 21	26.03. 21	GJW
151	SO 02-61-01 - 3/3b - Trakční vedení, Smí-VCH	4 dny	22.03. 21	26.03. 21	EŽ
152	SO 91-31-51 - 3/3b - Výstroj a značení trati, Smí-Če	4 dny	22.03. 21	26.03. 21	STR
153	***Rekonstrukce mostu v km 4,680 a propustků v km 3,682+3,946+4,789+5,098 (sudá část)***	**89 dny**	**15.05. 21**	**12.08. 21**	
154	SO 02-34-04 - 3/3b - Žel. most v km 4,680	89 dny	15.05. 21	12.08. 21	EUR/FIR
155	SO 02-34-31 - 3/3b - Propustek v km 3,682	89 dny	15.05. 21	12.08. 21	EUR
156	SO 02-34-32 - 3/3b - Propustek v km 3,946	89 dny	15.05. 21	12.08. 21	STR
157	SO 02-34-34 - 3/3b - Propustek v km 4,789	89 dny	15.05. 21	12.08. 21	EUR
158	SO 02-34-36 - 3/3b - Propustek v km 5,098	89 dny	15.05. 21	12.08. 21	EUR
159	***Demolice mostu v km 4,352 a propustků v km 4,584+4,922 (sudá část)***	**29 dny**	**15.05. 21**	**13.06. 21**	
160	SO 02-34-02 - 3/3b - Most v km 4,352 (demolice)	29 dny	15.05. 21	13.06. 21	STR/MTS
161	SO 02-34-33 - 3/3b - Propustek v km 4,584 (demolice)	29 dny	15.05. 21	13.06. 21	EUR
162	SO 02-34-35 - 3/3b - Propustek v km 4,922 (demolice)	29 dny	15.05. 21	13.06. 21	EUR
163	***Zárubní zdi v km 3,6 - 4,0 a 5,3 - 5,5***	**59 dny**	**27.03. 21**	**25.05. 21**	
164	SO 02-34-51 - 3/3b - Zárubní zeď v km 3,6 - 4,0	59 dny	27.03. 21	25.05. 21	EUR
165	***Základy TV + podpěry TV koleje 2 odbočka Barrandov - Velká Chuchle včetně úpravy pod mostem v km 10,824 trati 521A***	**119 dny**	**27.03. 21**	**24.07. 21**	
166	SO 02-61-01 - 3/3b - Trakční vedení, Smí-VCH	119 dny	27.03. 21	24.07. 21	EŽ
167	***Svršek + trakce koleje 2 odbočka Barrandov - Velká Chuchle***	**5 dny**	**13.08. 21**	**18.08. 21**	
168	SO 02-31-02 - 3/3b - Žel. svršek, kol.č.2, Smí-VCH	5 dny	13.08. 21	18.08. 21	GJW
169	SO 02-61-01 - 3/3b - Trakční vedení, Smí-VCH	5 dny	13.08. 21	18.08. 21	EŽ
170	SO 02-67-01 - 3/3b - Ukolejnění, Smí-VCH	5 dny	13.08. 21	18.08. 21	EŽ
171	SO 91-31-51 - 3/3b - Výstroj a značení trati, Smí-Če	5 dny	13.08. 21	18.08. 21	STR
172	**4/4a - Rekonstrukce koleje 1 Barrandov - Závodiště**	**96 dny**	**09.09. 21**	**14.12. 21**	
173	Uzavírka ulice Podjezd (objížďka přes dočasný přejezd km 4,810)	86 dny	14.09. 21	09.12. 21	
174	PS 02-21-11 - 4/4a - TZZ, Smí-VCH	96 dny	09.09. 21	14.12. 21	STR/AŽD
175	PS 02-22-03 - 4/4a - Úprava stávajích DK, Smí-Rad	96 dny	09.09. 21	14.12. 21	EUR/AŽD
176	PS 91-22-01 - 4/4a - DOK a TK, Smí-Če	96 dny	09.09. 21	14.12. 21	EUR/AŽD
177	SO 02-31-11 - 4/4a - Žel. spodek, kol. č.1, Smí-VCH	86 dny	14.09. 21	09.12. 21	EUR
178	SO 02-35-05 - 4/4a - Úprava rozvodu VN 22 kV PREDI, most v km 4,680	13 dny	22.11. 21	05.12. 21	EUR/EL
179	SO 02-35-06 - 4/4a - Úprava rozvodu NN 0,4 kV PREDI, most v km 4,680	13 dny	22.11. 21	05.12. 21	EUR/EL
180	SO 02-35-07 - 4/4a - Úprava veřejného osvětlení, most v km 4,680	13 dny	22.11. 21	05.12. 21	EUR/EL
181	SO 02-35-23 - 4/4a - Úprava sdělovacích kabelů PREDI, Smí-Rad	14 dny	22.11. 21	05.12. 21	EUR/EL
182	SO 02-36-41 - 4/4a - Přeložka kanalizace v km 4,721	86 dny	14.09. 21	09.12. 21	EUR
183	SO 02-36-61 -4/4a - Přeložka plynovodu v km 4,719	86 dny	14.09. 21	09.12. 21	EUR
184	SO 02-38-01 - 4/4a - Úprava komunikace pod mostem v km 4,680	96 dny	09.09. 21	14.12. 21	EUR/PHA
185	SO 91-61-51 - 4/4a - Převěšení závěsného optického kabelu SŽDC, Smí-Če	96 dny	09.09. 21	14.12. 21	EŽ
186	SO 02-64-01 -4/4a - Elektrický ohřev výměn, odbočka VCH	96 dny	09.09. 21	14.12. 21	EUR/EL
187	SO 02-66-01 - 4/4a - Rozvod NN, osvětlení, TM Chuchle	96 dny	09.09. 21	14.12. 21	EUR/EL
188	SO 02-66-21 - 4/4a - Úprava rozvodu VN 6 kV 50 Hz, napojení, TM Chuchle	96 dny	09.09. 21	14.12. 21	EUR/EL
189	SO 02-66-61 - 4/4a - Dálkové ovládání odpojovačů a návěst č.50, TM Chuchle	96 dny	09.09. 21	14.12. 21	EUR/EL
190	SO 02-66-62 - 4/4a - Dálkové ovládání odpojovačů, odbočka VCH	96 dny	09.09. 21	14.12. 21	EUR/EL
191	***Demontáž svršku a trakce koleje 1 odbočka Barrandov - Velká Chuchle***	**4 dny**	**09.09. 21**	**13.09. 21**	
192	SO 02-31-01 - 4/4a - Žel. svršek, kol.č.1, Smí-VCH	4 dny	09.09. 21	13.09. 21	STR
193	SO 02-61-01 - 4/4a - Trakční vedení, Smí-VCH	4 dny	09.09. 21	13.09. 21	EŽ
194	SO 91-31-51 - 4/4a - Výstroj a značení trati, Smí-Če	4 dny	09.09. 21	13.09. 21	STR
195	***Rekonstrukce mostu v km 4,680 a propustků v km 3,682+3,946+4,789+5,098 (lichá část)***	**86 dny**	**14.09. 21**	**09.12. 21**	
196	SO 02-34-04 - 4/4a - Žel. most v km 4,680	86 dny	14.09. 21	09.12. 21	EUR/FIR
197	SO 02-34-31 - 4/4a - Propustek v km 3,682	86 dny	14.09. 21	09.12. 21	EUR
198	SO 02-34-32 - 4/4a - Propustek v km 3,946	86 dny	14.09. 21	09.12. 21	STR
199	SO 02-34-34 - 4/4a - Propustek v km 4,789	86 dny	14.09. 21	09.12. 21	EUR
200	SO 02-34-36 - 4/4a - Propustek v km 5,098	86 dny	14.09. 21	09.12. 21	EUR
201	***Demolice mostu v km 4,352 a propustků v km 4,584+4,922 (lichá část)***	**29 dny**	**14.09. 21**	**13.10. 21**	
202	SO 02-34-02 - 3/3b - Most v km 4,352 (demolice)	29 dny	14.09. 21	13.10. 21	STR/MTS
203	SO 02-34-33 - 3/3b - Propustek v km 4,584 (demolice)	29 dny	14.09. 21	13.10. 21	EUR
204	SO 02-34-35 - 3/3b - Propustek v km 4,922 (demolice)	29 dny	14.09. 21	13.10. 21	EUR
205	***Základy TV + podpěry TV koleje 1 odbočka Barrandov - Velká Chuchle***	**59 dny**	**14.09. 21**	**12.11. 21**	
206	SO 02-61-01 - 3/3b	59 dny	14.09. 21	12.11. 21	
207	***Svršek + trakce koleje 1 odbočka Barrandov - Velká Chuchle***	**4 dny**	**10.12. 21**	**14.12. 21**	
208	SO 02-31-01 - 4/4a - Žel. svršek, kol.č.1, Smí-VCH	4 dny	10.12. 21	14.12. 21	STR
209	SO 02-61-01 - 4/4a - Trakční vedení, Smí-VCH	4 dny	10.12. 21	14.12. 21	EŽ
210	SO 02-67-01 - 4/4a - Ukolejnění, Smí-VCH	4 dny	10.12. 21	14.12. 21	EŽ
211	SO 91-31-51 - 4/4a - Výstroj a značení trati, Smí-Če	4 dny	10.12. 21	14.12. 21	STR
212	**4/4b - Demontáž dočasného přejezdu v km 4,810**	**0 dny**	**15.12. 21**	**15.12. 21**	
213	***Demontáž dočasného přejezdu v km 4,810***	**0 dny**	**15.12. 21**	**15.12. 21**	
214	SO 02-31-11 - 0/0b - Žel. spodek, kol. č.1, Smí-VCH	0 dny	15.12. 21	15.12. 21	EUR
215	SO 02-31-12 - 0/0b - Žel. spodek, kol.č.2, Smí-VCH	0 dny	15.12. 21	15.12. 21	EUR
216	zimní přestávka	53 dny	16.12. 21	07.02. 22	
217	**4/4c - Práce v liché skuponě žst. Praha - Radotín**	**6 dny**	08.02. 22	14.02. 22	
218	SO 02-38-21 - zpevněné plochy, TM Chuchle	94 dny	15.02. 22	20.05. 22	EUR/PHA
219	SO 02-51-53 - Oplocení, TM Chuchle	94 dny	15.02. 22	20.05. 22	STR
220	**5/5a - Zrušení odbočky Barrandov 1.část**	**4 dny**	**21.05. 22**	**25.05. 22**	
221	***Náhrada výhybek PX2, PX 3 kolejovým polem + úprava TV***	**4 dny**	**21.05. 22**	**25.05. 22**	
222	SO 02-31-02 - 5/5a - Žel. svršek, kol.č.2, Smí-VCH	4 dny	21.05. 22	25.05. 22	GJW
223	SO 02-31-12 - 5/5a - Žel. spodek, kol.č.2, Smí-VCH	4 dny	21.05. 22	25.05. 22	EUR
224	SO 91-31-51 - 5/5a - Výstroj a značení trati, Smí-Če	4 dny	21.05. 22	25.05. 22	STR
225	**5/5b - Zrušení odbočky Barrandov 2.část**	**4 dny**	**26.05. 22**	**30.05. 22**	
226	***Náhrada výhybek PX1, PX 4 kolejovým polem + úprava TV***	**4 dny**	**26.05. 22**	**30.05. 22**	
227	SO 02-31-01 - 5/5b - Žel. svršek, kol.č.1, Smí-VCH	4 dny	26.05. 22	30.05. 22	STR

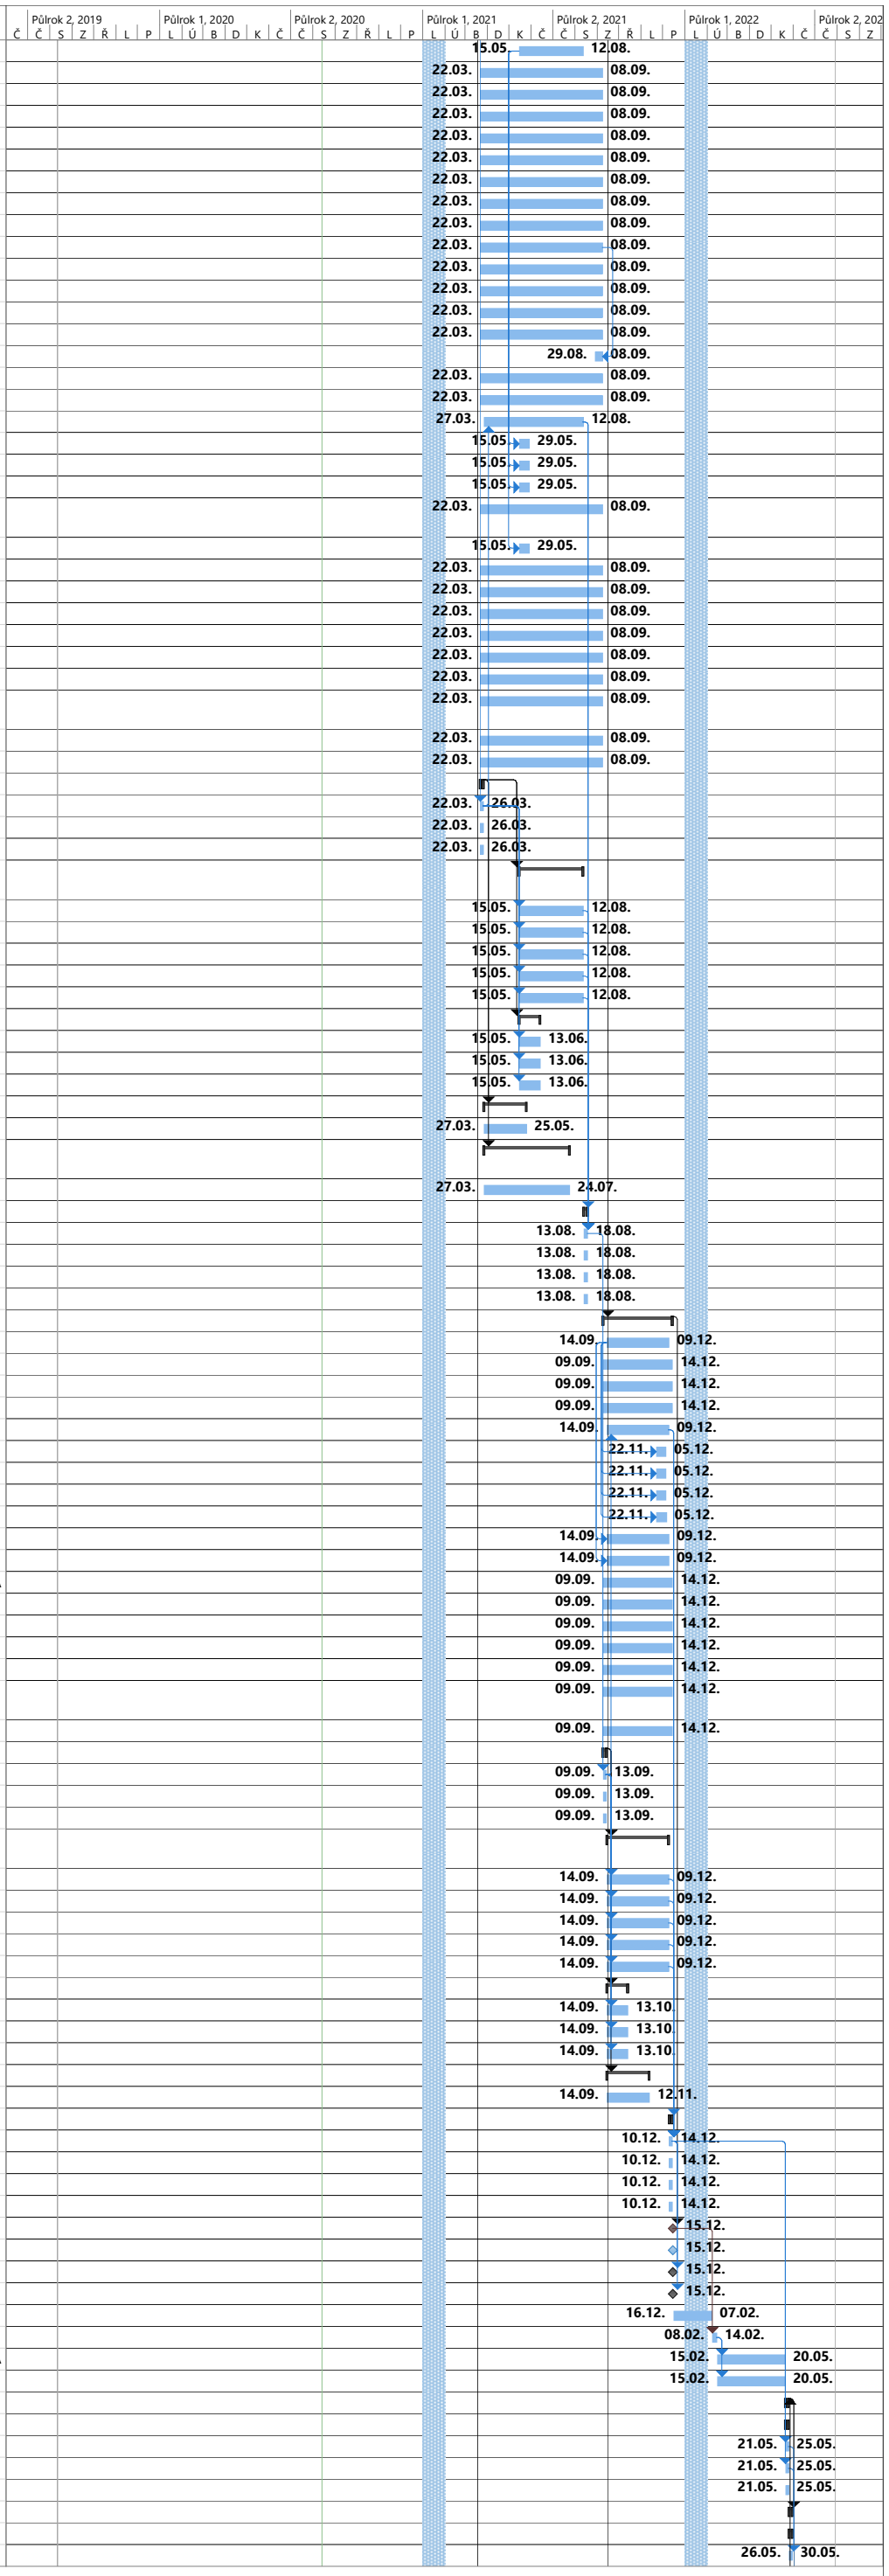

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Zhotovitel
228	SO 02-31-11 - 5/5b - Žel. spodek, kol. č.1, Smí-VCH	4 dny	26.05. 22	30.05. 22	EUR
229	SO 91-31-51 - 5/5b - Výstroj a značení trati, Smí-Če	4 dny	26.05. 22	30.05. 22	STR
230	**Praha-Smíchov (mimo)**	**13 dny**	**31.03. 20**	**13.04. 20**	
231	**0/0a - Přeložka trati Praha - Smíchov - Rudná u Prahy (km cca 1,600 - 2,100)**	**10 dny**	**28.03. 20**	**07.04. 20**	
232	PS 02-21-11 - 0/0a - TZZ, Smí-VCH	10 dny	28.03. 20	07.04. 20	STR/AŽD
233	***Přeložka traťové koleje Praha-Smíchov - Rudná u Prahy (km cca 1,600 - 2,100)***	**10 dny**	**28.03. 20**	**07.04. 20**	
234	SO 02-31-02 - 0/0a - Žel. svršek, kol.č.2, Smí-VCH	10 dny	28.03. 20	07.04. 20	GJW
235	SO 02-31-12 - 0/0a - Žel. spodek, kol.č.2, Smí-VCH	10 dny	28.03. 20	07.04. 20	EUR
236	SO 91-31-51 - 0/0a - Výstroj a značení trati, Smí-Če	10 dny	28.03. 20	07.04. 20	STR
237	**Praha-Vršovice seřazovací nádraží - Praha-Radotín**	**329 dny**	**22.03. 21**	**14.02. 22**	
238	**3/3b - Rekonstrukce mostu v km 9,680 (Praha-Krč - odbočka Tunel)**	**59 dny**	**22.03. 21**	**20.05. 21**	
239	***Sanace nosné konstrukce nad vyloučenou kolejí 2 Barrandov - Praha-Radotín***	**59 dny**	**22.03. 21**	**20.05. 21**	
240	SO 02-34-03 - 0/0b - Žel. most v km 9,680 (trať č.521A)	59 dny	22.03. 21	20.05. 21	STR/MTS
241	***Montáž zábrany proti dotyku nad vyloučenou kolejí 2 Barrandov - Praha-Radotín***	**9 dny**	**11.05. 21**	**20.05. 21**	
242	SO 02-34-03 - 0/0b - Žel. most v km 9,680 (trať č.521A)	9 dny	11.05. 21	20.05. 21	STR/MTS
243	**4/4a - Rekonstrukce mostu v km 9,680 (Praha-Krč - odbočka Tunel) a mostu v km 10,824 (odbočka Tunel - Praha-Radotín)**	**88 dny**	**09.09. 21**	**06.12. 21**	
244	PS 02-21-01 - 4/4a - SZZ, VCH	88 dny	09.09. 21	06.12. 21	STR/AŽD
245	PS 02-21-11 - 4/4a - TZZ, Smí-VCH	88 dny	09.09. 21	06.12. 21	STR/AŽD
246	PS 02-21-12 - 4/4a- TZZ, Krč-VCH	88 dny	09.09. 21	06.12. 21	STR/AŽD
247	PS 02-22-02 - 4/4a - MK, odbočka VCH	88 dny	09.09. 21	06.12. 21	EUR/AŽD
248	PS 02-22-05 - 4/4a - DOK a TK, Rad-Krč	88 dny	09.09. 21	06.12. 21	EUR/AŽD
249	PS 91-22-01 - 4/4a - DOK a TK, Smí-Če	88 dny	09.09. 21	06.12. 21	EUR/AŽD
250	***Sanace nosné konstrukce mostu v km 9,680 nad vyloučenou kolejí 1 Barrandov - Praha-Radotín***	**59 dny**	**09.09. 21**	**07.11. 21**	
251	SO 02-34-03 - 4/4a - Žel. most v km 9,680 (trať č.521A)	59 dny	09.09. 21	07.11. 21	STR/MTS
252	***Montáž zábrany proti dotyku na mostě v km 9,680 nad vyloučenou kolejí 1 Barrandov - Praha-Radotín***	**9 dny**	**29.10. 21**	**07.11. 21**	
253	SO 02-34-03 - 4/4a - Žel. most v km 9,680 (trať č.521A)	9 dny	29.10. 21	07.11. 21	STR/MTS
254	***Demontáž svršku a trakce koleje 1 (3) odbočka Tunel - most km 10,824 včetně***	**1 den**	**09.09. 21**	**10.09. 21**	
255	SO 02-31-03 - 4/4a - Žel. svršek, lichá skupina, odbočka VCH	1 den	09.09. 21	10.09. 21	GJW
256	SO 91-31-51 - 4/4a - Výstroj a značení trati, Smí-Če	1 den	09.09. 21	10.09. 21	STR
257	***Rekonstrukce mostu v km 10,824 (odbočka Tunel - Praha-Radotín)***	**69 dny**	**11.09. 21**	**19.11. 21**	
258	SO 02-34-05 - 4/4a - Žel. most v km 10,824 (trať č.521A)	69 dny	11.09. 21	19.11. 21	STR/MTS
259	***Montáž svršku a trakce koleje 1 (3) odbočka Tunel - most km 10,824 včetně***	**1 den**	**20.11. 21**	**21.11. 21**	
260	SO 02-31-03 - 4/4a - Žel. svršek, lichá skupina, odbočka VCH	1 den	20.11. 21	21.11. 21	GJW
261	SO 91-31-51 - 4/4a - Výstroj a značení trati, Smí-Če	1 den	20.11. 21	21.11. 21	STR
262	***Demontáž ochranného lešení nad oběma traťovými kolejemi Praha-Smíchov - Praha-Radotín (16 x noc)***	**16 dny**	**20.11. 21**	**06.12. 21**	
263	SO 02-34-05 - 4/4a - Žel. most v km 10,824 (trať č.521A)	16 dny	20.11. 21	06.12. 21	STR/MTS
264	zimní přestávka	62 dny	07.12. 21	07.02. 22	
265	**4/4c - Práce v liché skupině žst. Praha - Radotín**	**6 dny**	08.02. 22	14.02. 22	
266	**Praha-Velká Chuchle /Závodiště**	**976 dny**	**12.08. 19**	**14.04. 22**	
267	**P - Přípravné práce**	**220 dny**	**12.08. 19**	**19.03. 20**	
268	PS 02-22-02 - P - MK, odbočka VCH	220 dny	12.08. 19	19.03. 20	EUR/AŽD
269	PS 02-22-03 - P - Úprava stávajích DK, Smí-Rad	220 dny	12.08. 19	19.03. 20	EUR/AŽD
270	PS 02-22-14 - P - EZS, odbočka VCH	220 dny	12.08. 19	19.03. 20	EUR/AŽD
271	PS 02-22-15 - P - ASHS, odbočka VCH	220 dny	12.08. 19	19.03. 20	EUR/AŽD
272	PS 02-22-16 - P - Sdělovací zařízení, odbočka VCH	220 dny	12.08. 19	19.03. 20	EUR/AŽD
273	PS 02-22-22 - P - Kamerový systém, odbočka VCH	220 dny	12.08. 19	19.03. 20	EUR/AŽD
274	PS 02-64-01 - P - Elektrický ohřev výměn, odbočka VCH	220 dny	12.08. 19	19.03. 20	EUR/EL
275	SO 02-66-03 - P - Rozvod NN a osvětlení, odbočka VCH	220 dny	12.08. 19	19.03. 20	EUR/EL
276	***Dočasné SZZ odbočky Velká Chuchle (DSPŘ + výroba + testy + instalace)***	**220 dny**	**12.08. 19**	**19.03. 20**	
277	PS 02-21-01 - P - SZZ, VCH	220 dny	12.08. 19	19.03. 20	STR/AŽD
278	PS 91-22-01 - P - DOK a TK, Smí-Če	220 dny	12.08. 19	19.03. 20	EUR/AŽD
279	**Přístupy, plochy ZS, vytýčení IS**	220 dny	12.08. 19	19.03. 20	
280	***Kácení***	**147 dny**	**24.10. 19**	**19.03. 20**	
281	SO 91-71-01 - P - Odstranění mimolesní zeleně, Smí-Če	147 dny	24.10. 19	19.03. 20	EUR
282	***Rekonstrukce zdí v km 6,0 - 6,3 + 6,3 - 6,5 + 6,7 - 7,0 (horní části včetně kotev TV a návěstních lávek)***	**89 dny**	**04.09. 19**	**02.12. 19**	
283	SO 02-34-52 - P - Zárubní zeď v km 6,0 - 6,3	89 dny	04.09. 19	02.12. 19	EUR
284	SO 02-34-53 - P - Zárubní zeď v km 6,3 - 6,5	89 dny	04.09. 19	02.12. 19	EUR
285	SO 02-34-54 - P - Zárubní zeď v km 6,7 - 7,0	89 dny	04.09. 19	02.12. 19	EUR
286	SO 02-34-73 - P - Návěstní lávka v km 6,330	57 dny	04.09. 19	31.10. 19	EUR
287	SO 02-61-02 - P - Trakční vedení, VCH-Rad	89 dny	04.09. 19	02.12. 19	EŽ
288	SO 02-61-03 - P - Netypové brány trakčního vedení, VCH-Rad	89 dny	04.09. 19	02.12. 19	EŽ
289	***Stojka a základ návěstní lávky v km 6,330 vlevo***	**21 dny**	**23.03. 20**	**13.04. 20**	
290	SO 02-34-73 - P - Návěstní lávka v km 6,330	21 dny	23.03. 20	13.04. 20	EUR
291	Doplnění/pokračování na provizorním stavu PS 02-21-01	104 dny	01.04. 20	14.07. 20	STR/AŽD
292	***0/0b.1 - Zřízení odbočky Závodiště PX5,PX6***	***4 dny***	**30.04. 20**	**04.05. 20**	
293	PS 02-21-01 - 0/0b.1 - SZZ, VCH	4 dny	30.04. 20	04.05. 20	STR/AŽD
294	PS 02-22-02 - 0/0b.1 - MK, odbočka VCH	4 dny	30.04. 20	04.05. 20	EUR/AŽD
295	PS 02-22-16 - 0/0b.1 - Sdělovací zařízení, odbočka VCH	4 dny	30.04. 20	04.05. 20	EUR/AŽD
296	PS 02-22-03 - 0/0b.1 - Úprava stávajích DK, Smí-Rad	4 dny	30.04. 20	04.05. 20	EUR/AŽD
297	***Dočasná přeložka koleje 1 + vložení výhybek PX5, PX6***	**4 dny**	**30.04. 20**	**04.05. 20**	
298	SO 02-31-03 - 0/0b.1 - Žel. svršek, lichá skupina, odbočka VCH	4 dny	30.04. 20	04.05. 20	GJW
299	SO 91-31-51 - 0/0b.1 - Výstroj a značení trati, Smí-Če	4 dny	30.04. 20	04.05. 20	STR
300	***0/0b.2 - Zřízení odbočky Závodiště PX7,PX8***	***4 dny***	**07.05. 20**	**11.05. 20**	
301	PS 02-21-01 - 0/0b.2 - SZZ, VCH	4 dny	07.05. 20	11.05. 20	STR/AŽD
302	PS 02-22-02 - 0/0b.2 - MK, odbočka VCH	4 dny	07.05. 20	11.05. 20	EUR/AŽD
303	PS 02-22-16 - 0/0b.2 - Sdělovací zařízení, odbočka VCH	4 dny	07.05. 20	11.05. 20	EUR/AŽD
304	PS 02-22-03 - 0/0b.2 - Úprava stávajích DK, Smí-Rad	4 dny	07.05. 20	11.05. 20	EUR/AŽD
305	**Dočasná přeložka koleje 1 + vložení výhybek PX5, PX6**	**4 dny**	**07.05. 20**	**11.05. 20**	
306	SO 02-31-03 - 0/0b.2 - Žel. svršek, lichá skupina, odbočka VCH	4 dny	07.05. 20	11.05. 20	GJW
307	SO 91-31-51 - 0/0b.2 - Výstroj a značení trati, Smí-Če	4 dny	07.05. 20	11.05. 20	STR
308	**A02 - Aktivace TZZ Praha-Smíchov - odbočka Závodiště včetně**	**0 dny**	**14.07. 20**	**14.07. 20**	
309	PS 02-21-01 - A02 - SZZ, VCH	0 dny	14.07. 20	14.07. 20	STR/AŽD
310	***Osazení návěstní lávky v km 6,330***	**4 dny**	**18.05. 20**	**22.05. 20**	
311	SO 02-34-73 - 0/0b - Návěstní lávka v km 6,330	4 dny	18.05. 20	22.05. 20	EUR
312	zimní + technologická přestávka	341 dny	14.04. 20	21.03. 21	
313	SO 02-35-11 - Úprava rozvodu VN 22kV PREDi v km 6,307	91 dny	02.03. 20	01.06. 20	EUR/EL
314	SO 02-35-12 - Úprava rozvodu NN 0,4kV PREDi v km 6,307	91 dny	02.03. 20	01.06. 20	EUR/EL
315	SO 02-35-13 - Úprava VO v km 6,307	91 dny	02.03. 20	01.06. 20	EUR/EL
316	SO 02-66-03 - Rozvod NN a osvětlení, odbočka VCH	341 dny	25.03. 20	01.03. 21	EUR/EL
317	SO 02-66-04 - Rozvod NN a osvětlení, zastávka VCH	341 dny	25.03. 20	01.03. 21	EUR/EL
318	SO 02-51-03 - TO, odbočka VCH	365 dny	01.03. 20	01.03. 21	STR
319	SO 02-51-04 - Domek pro měnič zab.zař., odbočka VCH	365 dny	01.03. 20	01.03. 21	STR
320	**3/3b - Rekonstrukce koleje 2 Závodiště**	**170 dny**	**22.03. 21**	**08.09. 21**	
321	Omezení MK Dostihová - Starochuchelská	4 dny	22.03. 21	26.03. 21	
322	Omezení MK Dostihová - Starochuchelská	4 dny	04.09. 21	08.09. 21	
323	PS 02-21-01 - 3/3b - SZZ, VCH	170 dny	22.03. 21	08.09. 21	STR/AŽD
324	PS 02-21-13 - 3/3b - TZZ, VCH-Rad	170 dny	22.03. 21	08.09. 21	STR/AŽD
325	PS 02-22-02 - 3/3b - MK, odbočka VCH	170 dny	22.03. 21	08.09. 21	EUR/AŽD
326	PS 02-22-03 - 3/3b - Úprava stávajích DK, Smí-Rad	170 dny	22.03. 21	08.09. 21	EUR/AŽD
327	PS 02-22-16 - 3/3b - Sdělovací zařízení, odbočka VCH	170 dny	22.03. 21	08.09. 21	EUR/AŽD
328	PS 02-22-14 - 3 - EZS, odbočka VCH	170 dny	22.03. 21	08.09. 21	EUR/AŽD
329	PS 02-22-15 - 3/3b - EZS, odbočka VCH	170 dny	22.03. 21	08.09. 21	EUR/AŽD
330	PS 02-22-22 - 3/3b - Kamerový systém, odbočka VCH	170 dny	22.03. 21	08.09. 21	EUR/AŽD
331	PS 02-22-13 - 3/3b - Telefonní zapojovač, odbočka VCH	170 dny	22.03. 21	08.09. 21	EUR/AŽD
332	PS 02-22-23 - 3/3b - Rozhlasové zařízení, zastávka VCH	170 dny	22.03. 21	08.09. 21	EUR/AŽD
333	PS 02-22-24 - 3/3b - Informační zařízení, ŽST Rad	170 dny	22.03. 21	08.09. 21	EUR/EL
334	PS 02-22-25 - 3/3b - Kamerový systém, zastávka VCH	170 dny	22.03. 21	08.09. 21	STR/AŽD
335	PS 02-23-03 - 3/3b - DŘT, odbočka VCH	170 dny	22.03. 21	08.09. 21	EŽ

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Zhotovitel
336	PS 02-23-41 - 3/3b - Technologie, rozvodna 0,4 kV, odbočka VCH	170 dny	22.03. 21	08.09. 21	EUR/EL
337	PS 02-23-42 - 3/3b - Vlastní spotřeba, rozvodna 0,4 kV, odbočka VCH	170 dny	22.03. 21	08.09. 21	EUR/EL
338	PS 02-23-73 - 3/3b - Měnič pro napájení ZZ, odbočka VCH	170 dny	22.03. 21	08.09. 21	EUR/EL
339	PS 02-23-74 - 3/3b - Rozvaděč zajištěné sítě, odbočka VCH	170 dny	22.03. 21	08.09. 21	EUR/EL
340	PS 91-22-02 - 3/3b - Přenosový systém, Smí-Če	170 dny	22.03. 21	08.09. 21	EUR/AŽD
341	PS 92-23-01 - 3/3b - Doplnění DŘT, ED Křenovka	170 dny	22.03. 21	08.09. 21	EŽ
342	SO 02-31-12 - 3/3b - Žel. spodek, kol.č.2, Smí-VCH	144 dny	27.03. 21	18.08. 21	EUR
343	SO 02-31-14 - 3/3b - Žel. spodek, sudá skupina, odbočka VCH	144 dny	27.03. 21	18.08. 21	EUR
344	SO 02-31-16 - 3/3b - Žel. spodek, sudá skupina, VCH-Rad	144 dny	27.03. 21	18.08. 21	EUR
345	SO 02-33-01 - 3/3b - Žel. přejezd v km 6,290	4 dny	04.09. 21	08.09. 21	GJW
346	SO 02-38-23 - 3/3b - Přístupy na nástupiště, zastávka VCH	170 dny	22.03. 21	08.09. 21	EUR/PHA
347	SO 02-40-52 - 3/3b - PHS, ulice Nad Drahou, VCH	170 dny	22.03. 21	08.09. 21	EUR
348	SO 02-64-01 - 3/3b - Elektrický ohřev výměn, odbočka VCH	170 dny	22.03. 21	08.09. 21	EUR/EL
349	SO 02-66-02 - 3/3b - Přípojka NN pro TO, odbočka VCH	170 dny	22.03. 21	08.09. 21	EUR/EL
350	SO 02-66-03 - 3/3b - Rozvod NN a osvětlení, odbočka VCH	170 dny	22.03. 21	08.09. 21	EUR/EL
351	SO 02-66-04 - 3/3b - Rozvod NN a osvětlení, zastávka VCH	170 dny	22.03. 21	08.09. 21	EUR/EL
352	***Demontáž svršku a trakce kolejí 2 (odbočka Barrandov - Praha-Radotín/odbočka Tunel - Praha-Radotín)***	**4 dny**	**22.03. 21**	**26.03. 21**	
353	SO 02-31-02 - 3/3b - Žel. svršek, kol.č.2, Smí-VCH	4 dny	22.03. 21	26.03. 21	GJW
354	SO 02-31-04 - 3/3b - Žel. svršek, sudá skupina, odbočka VCH	4 dny	22.03. 21	26.03. 21	GJW
355	SO 02-31-06 - 3/3b - Žel. svršek, sudá skupina, VCH-Rad	4 dny	22.03. 21	26.03. 21	STR
356	SO 91-31-51 - 3/3b - Výstroj a značení trati, Smí-Če	4 dny	22.03. 21	26.03. 21	STR
357	***Demolice nástupiště 2 zastávky Praha-Velká Chuchle***	**4 dny**	**22.03. 21**	**26.03. 21**	
358	SO 02-32-02 - 3/3b - Nástupiště č.2, zastávka VCH	4 dny	22.03. 21	26.03. 21	EUR
359	SO 02-52-02 - 3/3b - Přístřešky na nástupišti č.2, zastávka VCH	4 dny	22.03. 21	26.03. 21	EUR
360	***Rekonstrukce mostu v km 6,277 a propustku v km 5,924 (sudá část)***	**79 dny**	**27.03. 21**	**14.06. 21**	
361	SO 02-34-06 - 3/3b - Žel. most v km 6,277	79 dny	27.03. 21	14.06. 21	STR/MTS
362	SO 02-34-37 - 3/3b - Žel. propustek v km 5,924	79 dny	27.03. 21	14.06. 21	EUR
363	***Rekonstrukce propustku v km 6,914 (sudá část)***	**29 dny**	**11.05. 21**	**09.06. 21**	
364	SO 02-34-39 - 3/3b - Žel. propustek v km 6,914	29 dny	11.05. 21	09.06. 21	EUR
365	***Demolice mostu v km 6,805 (sudá část)***	**29 dny**	**10.06. 21**	**09.07. 21**	
366	SO 02-34-22 - 3/3b - Žel. podchod v km 6,805, demolice	29 dny	10.06. 21	09.07. 21	EUR
367	***Most v km 6,466 a rekonstrukce propustku v km 6,570 (sudá část)***	**59 dny**	**10.06. 21**	**08.08. 21**	
368	SO 02-34-21 - 3/3b - Žel. podchod v km 6,466, zastávka VCH	59 dny	10.06. 21	08.08. 21	EUR
369	SO 02-34-38 - 3/3b - Žel. propustek v km 6,570	59 dny	10.06. 21	08.08. 21	EUR
370	***Rekonstrukce zdí v km 6,0 - 6,3 + 6,3 - 6,5 + 6,7 - 7,0 (dolní části, žlaby)***	**44 dny**	**27.03. 21**	**10.05. 21**	
371	SO 02-34-52 - 3/3b - Zárubní zeď v km 6,0 - 6,3	44 dny	27.03. 21	10.05. 21	EUR
372	SO 02-34-53 - 3/3b - Zárubní zeď v km 6,3 - 6,5	44 dny	27.03. 21	10.05. 21	EUR
373	SO 02-34-54 - 3/3b - Zárubní zeď v km 6,7 - 7,0	44 dny	27.03. 21	10.05. 21	EUR
374	***Dočasné nástupiště 1 zastávky Praha-Velká Chuchle***	**9 dny**	**19.08. 21**	**28.08. 21**	
375	SO 02-32-01 - 3/3b - Nástupiště č.1, zastávka VCH	9 dny	19.08. 21	28.08. 21	EUR
376	***Nástupiště 2 zastávky Praha-Velká Chuchle***	**25 dny**	**09.08. 21**	**03.09. 21**	
377	SO 02-32-02 - 3/3b - Nástupiště č.2, zastávka VCH	25 dny	09.08. 21	03.09. 21	EUR
378	SO 02-52-02 - 3/3b - Přístřešky na nástupišti č.2, zastávka VCH	25 dny	09.08. 21	03.09. 21	EUR
379	SO 02-54-01 - 3/3b - Orientační systém, zastávka VCH	25 dny	09.08. 21	03.09. 21	EUR
380	SO 02-54-02 - 3/3b - Hlasové majáčky, zastávka VCH	25 dny	09.08. 21	03.09. 21	EUR
381	SO 02-60-01 - 3/3b - Drobná architektura, zastávka VCH	25 dny	09.08. 21	03.09. 21	EUR
382	***Základy TV + podpěry TV kolejí 2, 4***	**49 dny**	**11.05. 21**	**29.06. 21**	
383	SO 02-61-02 - 3/3b - Trakční vedení, VCH-Rad	49 dny	11.05. 21	29.06. 21	EŽ
384	SO 02-61-03 - 3/3b - Netypové brány trakčního vedení, VCH-Rad	49 dny	11.05. 21	29.06. 21	EŽ
385	***Svršek + trakce kolejí 2, 4, výhybky 2, 4 odbočky Velká Chuchle***	**20 dny**	**19.08. 21**	**08.09. 21**	
386	SO 02-31-02 - 3/3b - Žel. svršek, kol.č.2, Smí-VCH	20 dny	19.08. 21	08.09. 21	GJW
387	SO 02-31-04 - 3/3b - Žel. svršek, sudá skupina, odbočka VCH	20 dny	19.08. 21	08.09. 21	GJW
388	SO 02-31-06 - 3/3b - Žel. svršek, sudá skupina, VCH-Rad	20 dny	19.08. 21	08.09. 21	STR
389	SO 02-61-02 - 3/3b - Trakční vedení, VCH-Rad	20 dny	19.08. 21	08.09. 21	EŽ
390	SO 02-61-03 - 3/3b - Netypové brány trakčního vedení, VCH-Rad	20 dny	19.08. 21	08.09. 21	EŽ
391	SO 02-67-02 - 3/3b - Ukolejnění, VCH-Rad	20 dny	19.08. 21	08.09. 21	EŽ
392	SO 91-31-51 - 3/3b - Výstroj a značení trati, Smí-Če	20 dny	19.08. 21	08.09. 21	STR
393	**3/3c - Dočasné nástupiště 1 zastávky Praha-Velká Chuchle: dokončení**	**2 dny**	**06.09. 21**	**08.09. 21**	
394	***Dočasné nástupiště 1 zastávky Praha-Velká Chuchle (dokončení) + dočasný přechod přes koleje 1, 3***	**2 dny**	**06.09. 21**	**08.09. 21**	
395	SO 02-32-01 - 3/3c - Nástupiště č.1, zastávka VCH	2 dny	06.09. 21	08.09. 21	EUR
396	**4/4a - Rekonstrukce liché skupiny Závodiště**	**96 dny**	**09.09. 21**	**14.12. 21**	
397	Omezení MK Dostihová - Starochuchelská	4 dny	09.09. 21	13.09. 21	
398	Omezení MK Dostihová - Starochuchelská	4 dny	10.12. 21	14.12. 21	
399	PS 02-21-01 - 4/4a - SZZ, VCH	96 dny	09.09. 21	14.12. 21	STR/AŽD
400	PS 02-21-13 - 4/4a - TZZ, VCH-Rad	96 dny	09.09. 21	14.12. 21	STR/AŽD
401	PS 02-22-02 - 4/4a - MK, odbočka VCH	96 dny	09.09. 21	14.12. 21	EUR/AŽD
402	PS 02-22-03 - 4/4a - Úprava stávajích DK, Smí-Rad	96 dny	09.09. 21	14.12. 21	EUR/AŽD
403	PS 02-22-16 - 4/4a - Sdělovací zařízení, odbočka VCH	96 dny	09.09. 21	14.12. 21	EUR/AŽD
404	PS 02-22-22 - 4/4a - Kamerový systém, odbočka VCH	96 dny	09.09. 21	14.12. 21	EUR/AŽD
405	PS 02-22-13 - 4/4a - Telefonní zapojovač, odbočka VCH	96 dny	09.09. 21	14.12. 21	EUR/AŽD
406	PS 02-22-23 - 4/4a - Rozhlasové zařízení, zastávka VCH	96 dny	09.09. 21	14.12. 21	EUR/AŽD
407	PS 02-22-24 - 4/4a - Informační zařízení, ŽST Rad	96 dny	09.09. 21	14.12. 21	EUR/EL
408	PS 02-22-25 - 4/4a - Kamerový systém, zastávka VCH	96 dny	09.09. 21	14.12. 21	STR/AŽD
409	PS 91-22-01 - 4/4a - DOK a TK, Smí-Če	96 dny	09.09. 21	14.12. 21	EUR/AŽD
410	SO 02-31-11 - 4/4a - Žel. spodek, kol. č.1, Smí-VCH	71 dny	14.09. 21	24.11. 21	EUR
411	SO 02-31-13 - 4/4a - Žel. spodek, lichá skupina, odbočka VCH	71 dny	14.09. 21	24.11. 21	EUR
412	SO 02-31-15 - 4/4a - Žel. spodek, lichá skupina, VCH-Rad	71 dny	14.09. 21	24.11. 21	EUR
413	SO 02-33-01 - 4/4a - Žel. přejezd v km 6,290	4 dny	10.12. 21	14.12. 21	GJW
414	SO 02-38-23 - 4/4a - Přístupy na nástupiště, zastávka VCH	96 dny	09.09. 21	14.12. 21	EUR/PHA
415	SO 02-40-01 - 4/4a - PHS, ulice Radotínká, VCH	96 dny	09.09. 21	14.12. 21	EUR
416	SO 02-51-54 -4/4a - Oplocení, VCH	96 dny	09.09. 21	14.12. 21	STR
417	SO 02-64-01 - 4/4a - Elektrický ohřev výměn, odbočka VCH	96 dny	09.09. 21	14.12. 21	EUR/EL
418	SO 02-66-02 - 4/4a - Přípojka NN pro TO, odbočka VCH	96 dny	09.09. 21	14.12. 21	EUR/EL
419	SO 02-66-03 - 4/4a - Rozvod NN a osvětlení, odbočka VCH	96 dny	09.09. 21	14.12. 21	EUR/EL
420	SO 02-66-04 - 4/4a - Rozvod NN a osvětlení, zastávka VCH	96 dny	09.09. 21	14.12. 21	EUR/EL
421	SO 91-61-51 - 4/4a - Převěšení závěsného optického kabelu SŽDC, Smí-Če	96 dny	09.09. 21	14.12. 21	EŽ
422	***Demontáž svršku a trakce kolejí 1 (odbočka Barrandov - Velká Chuchle/odbočka Tunel - Velká Chuchle)***	**4 dny**	**09.09. 21**	**13.09. 21**	
423	SO 02-31-01 - 4/4a - Žel. svršek, kol.č.1, Smí-VCH	4 dny	09.09. 21	13.09. 21	STR
424	SO 02-31-03 - 4/4a - Žel. svršek, lichá skupina, odbočka VCH	4 dny	09.09. 21	13.09. 21	GJW
425	SO 02-31-05 - 4/4a - Žel. svršek, lichá skupina, VCH-Rad	4 dny	09.09. 21	13.09. 21	GJW
426	SO 91-31-51 - 4/4a - Výstroj a značení trati, Smí-Če	4 dny	09.09. 21	13.09. 21	STR
427	***Demolice nástupiště 1 zastávky Závodiště***	**4 dny**	**09.09. 21**	**13.09. 21**	
428	SO 02-32-01 - 4/4a - Nástupiště č.1, zastávka VCH	4 dny	09.09. 21	13.09. 21	EUR
429	SO 02-52-01 - 4/4a - Přístřešky na nástupišti č.1, zastávka VCH	4 dny	09.09. 21	13.09. 21	EUR
430	***Rekonstrukce mostu v km 6,277 a propustků v km 5,924+6,570+6,914 (lichá část)***	**86 dny**	**14.09. 21**	**09.12. 21**	
431	SO 02-34-06 - 4/4a - Žel. most v km 6,277	86 dny	14.09. 21	09.12. 21	STR/MTS
432	SO 02-34-37 - 4/4a - Žel. propustek v km 5,924	86 dny	14.09. 21	09.12. 21	EUR
433	SO 02-34-38 - 4/4a - Žel. propustek v km 6,570	86 dny	14.09. 21	09.12. 21	EUR
434	SO 02-34-39 - 4/4a - Žel. propustek v km 6,914	86 dny	14.09. 21	09.12. 21	EUR
435	***Demolice mostu v km 6,805 (lichá část)***	**29 dny**	**14.09. 21**	**13.10. 21**	
436	SO 02-34-22 - 4/4a - Žel. podchod v km 6,805, demolice	29 dny	14.09. 21	13.10. 21	EUR
437	***Most v km 6,466 (lichá část) + zeď v km 6,4 - 6,6***	**79 dny**	**14.09. 21**	**02.12. 21**	
438	SO 02-34-21 - 4/4a - Žel. podchod v km 6,466, zastávka VCH	79 dny	14.09. 21	02.12. 21	EUR
439	SO 02-34-57 - 4/4a - Opěrná zeď v km 6,4 - 6,6, zastávka VCH	79 dny	14.09. 21	02.12. 21	EUR
440	***Nástupiště 1 zastávky Praha-Velká Chuchle***	**26 dny**	**14.11. 21**	**10.12. 21**	
441	SO 02-32-01 - 4/4a - Nástupiště č.1, zastávka VCH	26 dny	14.11. 21	10.12. 21	EUR
442	SO 02-52-01 - 4/4a - Přístřešky na nástupišti č.1, zastávka VCH	26 dny	14.11. 21	10.12. 21	EUR
443	SO 02-54-01 - 4/4a - Orientační systém, zastávka VCH	26 dny	14.11. 21	10.12. 21	EUR
444	SO 02-54-02 - 4/4a - Hlasové majáčky, zastávka VCH	26 dny	14.11. 21	10.12. 21	EUR
445	SO 02-60-01 - 4/4a - Drobná architektura, zastávka VCH	26 dny	14.11. 21	10.12. 21	EUR
446	***Základy TV + podpěry TV kolejí 1, 3***	**49 dny**	**14.09. 21**	**02.11. 21**	
447	SO 02-61-02 - 4/4a - Trakční vedení, VCH-Rad	49 dny	14.09. 21	02.11. 21	EŽ
448	SO 02-61-03 - 4/4a - Netypové brány trakčního vedení, VCH-Rad	49 dny	14.09. 21	02.11. 21	EŽ

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Zhotovitel
449	***Svršek + trakce kolejí 1, 3, výhybky 1, 3 odbočky Velká Chuchle***	**19 dny**	**25.11. 21**	**14.12. 21**	
450	SO 02-31-01 - 4/4a - Žel. svršek, kol.č.1, Smí-VCH	19 dny	25.11. 21	14.12. 21	STR
451	SO 02-31-03 - 4/4a - Žel. svršek, lichá skupina, odbočka VCH	19 dny	25.11. 21	14.12. 21	GJW
452	SO 02-31-05 - 4/4a - Žel. svršek, lichá skupina, VCH-Rad	19 dny	25.11. 21	14.12. 21	GJW
453	SO 02-61-02 - 4/4a - Trakční vedení, VCH-Rad	19 dny	25.11. 21	14.12. 21	EŽ
454	SO 02-61-03 - 4/4a - Netypové brány trakčního vedení, VCH-Rad	19 dny	25.11. 21	14.12. 21	EŽ
455	SO 02-67-02 - 4/4a - Ukolejnění, VCH-Rad	19 dny	25.11. 21	14.12. 21	EŽ
456	SO 91-31-51 - 4/4a - Výstroj a značení trati, Smí-Če	19 dny	25.11. 21	14.12. 21	STR
457	**4/4b - Demolice dočasného nástupiště 1 Praha-Velká Chuchle**	**0 dny**	**15.12. 21**	**15.12. 21**	
458	***Demolice dočasného nástupiště 1 Praha-Velká Chuchle***	**0 dny**	**15.12. 21**	**15.12. 21**	
459	SO 02-32-01 - 4/4b - Nástupiště č.1, zastávka VCH	0 dny	15.12. 21	15.12. 21	EUR
460	***Demolice dočasného přechodu k dočasnému nástupišti 1 Praha-Velká Chuchle***	**0 dny**	**15.12. 21**	**15.12. 21**	
461	SO 02-32-01 - 4/4b - Nástupiště č.1, zastávka VCH	0 dny	15.12. 21	15.12. 21	EUR
462	zimní přestávka	53 dny	16.12. 21	07.02. 22	
463	**4/4c - Práce v liché skupině žst. Praha-Radotín**	**6 dny**	08.02. 22	14.02. 22	
464	SO 02-38-22 - Zpevněné plochy, TO Chuchle	58 dny	15.02. 22	14.04. 22	EUR/PHA
465	**Závodiště - Praha-Radotín**	**917 dny**	**12.08. 19**	**14.02. 22**	
466	**P - Přípravné práce**	**220 dny**	**12.08. 19**	**19.03. 20**	
467	***Dočasné SZZ odbočky Velká Chuchle (DSPŘ + výroba + testy + instalace)***	**220 dny**	**12.08. 19**	**19.03. 20**	
468	PS 02-21-13 - P - TZZ, VCH-Rad	220 dny	12.08. 19	19.03. 20	STR/AŽD
469	PS 91-22-01 - P - DOK a TK, Smí-Če	220 dny	12.08. 19	19.03. 20	EUR/AŽD
470	**Přístupy, plochy ZS, vytýčení IS**	220 dny	12.08. 19	19.03. 20	
471	***Kácení***	**147 dny**	**24.10. 19**	**19.03. 20**	
472	SO 91-71-01 - P - Odstranění mimolesní zeleně, Smí-Če	147 dny	24.10. 19	19.03. 20	EUR
473	***Rekonstrukce zdí v km 7,4 - 7,9 a 8,0 - 8,5 (horní části včetně kotev TV a návěstních lávek)***	**89 dny**	**04.09. 19**	**02.12. 19**	
474	SO 02-34-55 - P - Zárubní zeď v km 7,4 - 7,9	89 dny	04.09. 19	02.12. 19	EUR
475	SO 02-34-56 - P - Zárubní zeď v km 8,0 - 8,5	89 dny	04.09. 19	02.12. 19	EUR
476	SO 02-34-74 - P - Návěstní lávka v km 7,437 (správně 7,250)	57 dny	04.09. 19	31.10. 19	EUR
477	SO 02-34-75 - P - Návěstní lávka v km 7,990	57 dny	04.09. 19	31.10. 19	EUR
478	SO 02-34-76 - P - Návěstní lávka v km 8,693	57 dny	04.09. 19	31.10. 19	EUR
479	SO 02-61-02 - P - Trakční vedení, VCH-Rad	89 dny	04.09. 19	02.12. 19	EŽ
480	***Stojky návěstních lávek v km 7,437 + 7,739 + 8,693 vlevo***	**21 dny**	**23.03. 20**	**13.04. 20**	
481	SO 02-34-74 - P - Návěstní lávka v km 7,437 (správně 7,250)	21 dny	23.03. 20	13.04. 20	EUR
482	SO 02-34-75 - P - Návěstní lávka v km 7,990	21 dny	23.03. 20	13.04. 20	EUR
483	SO 02-34-76 - P - Návěstní lávka v km 8,693	21 dny	23.03. 20	13.04. 20	EUR
484	***Osazení návěstních lávek v km 7,437 + 7,739 + 8,693***	**4 dny**	**18.05. 20**	**22.05. 20**	
485	SO 02-34-74 - 0/0b - Návěstní lávka v km 7,437 (správně 7,250)	4 dny	18.05. 20	22.05. 20	EUR
486	SO 02-34-75 - 0/0b - Návěstní lávka v km 7,990	4 dny	18.05. 20	22.05. 20	EUR
487	SO 02-34-76 - 0/0b - Návěstní lávka v km 8,693	4 dny	18.05. 20	22.05. 20	EUR
488	Doplnění/pokračování na provizorním stavu PS 02-21-13	104 dny	01.04. 20	14.07. 20	STR/AŽD
489	SO 02-35-14 - Úprava rozvodu VN 22kV PREDi v km 8,547	244 dny	01.01. 20	01.09. 20	EUR/EL
490	SO 02-35-23 - Úprava sdělovacích kabelů PREDI, Smí-Rad	120 dny	04.05. 20	01.09. 20	EUR/EL
491	SO 02-34-77 - Návěstní lávka v km 7,708 (demolice)	1 den	10.08. 20	11.08. 20	EUR
492	**3/3b - Rekonstrukce koleje 2 Závodiště - Praha - Radotín**	**170 dny**	**22.03. 21**	**08.09. 21**	
493	Uzavírka MK Radkovská - Radotínská	89 dny	26.05. 21	23.08. 21	
494	PS 02-21-13 3/3b - TZZ, VCH-Rad	170 dny	22.03. 21	08.09. 21	STR/AŽD
495	PS 03-22-01 - 3/3b - MK, ŽST Rad	170 dny	22.03. 21	08.09. 21	EUR/AŽD
496	SO 02-31-16 - 3/3b - Žel. spodek, sudá skupina, VCH-Rad	149 dny	27.03. 21	23.08. 21	EUR
497	SO 02-66-05 - Úprava přípojky NN, hradlo Závodiště	170 dny	22.03. 21	08.09. 21	EUR/EL
498	***Demontáž svršku a trakce kolejí 2 + 4 (odbočka Barrandov - Praha-Radotín/odbočka Tunel - Praha-Radotín)***	**4 dny**	**22.03. 21**	**26.03. 21**	
499	SO 02-31-06 - 3/3b - Žel. svršek, sudá skupina, VCH-Rad	4 dny	22.03. 21	26.03. 21	STR
500	SO 91-31-51 - 3/3b - Výstroj a značení trati, Smí-Če	4 dny	22.03. 21	26.03. 21	STR
501	***Rekonstrukce mostu v km 8,415 a propustků v km 7,416+7,598+7,791+7,987(sudá část)***	**89 dny**	**26.05. 21**	**23.08. 21**	
502	SO 02-34-07 - 3/3b - Žel. most v km 8,415	89 dny	26.05. 21	23.08. 21	EUR/MTS
503	SO 02-34-40 - 3/3b - Žel. propustek v km 7,416	89 dny	26.05. 21	23.08. 21	EUR
504	SO 02-34-41 - 3/3b - Žel. propustek v km 7,598	89 dny	26.05. 21	23.08. 21	EUR
505	SO 02-34-42 - 3/3b - Žel. propustek v km 7,791	89 dny	26.05. 21	23.08. 21	EUR
506	SO 02-34-43 - 3/3b - Žel. propustek v km 7,987	89 dny	26.05. 21	23.08. 21	EUR
507	***Zárubní zdi v km 7,4 - 7,9 + 8,0 - 8,5***	**59 dny**	**27.03. 21**	**25.05. 21**	
508	SO 02-34-55 - 3/3b - Zárubní zeď v km 7,4 - 7,9	59 dny	27.03. 21	25.05. 21	EUR
509	SO 02-34-56 - 3/3b - Zárubní zeď v km 8,0 - 8,5	59 dny	27.03. 21	25.05. 21	EUR
510	***Základy TV + podpěry TV kolejí 2, 4***	**49 dny**	**26.05. 21**	**14.07. 21**	
511	SO 02-61-02 - 3/3b - Trakční vedení, VCH-Rad	49 dny	26.05. 21	14.07. 21	EŽ
512	***Svršek + trakce kolejí 2, 4***	**9 dny**	**24.08. 21**	**02.09. 21**	
513	SO 02-31-06- 3/3b - Žel. svršek, sudá skupina, VCH-Rad	9 dny	24.08. 21	02.09. 21	STR
514	SO 02-61-02 - 3/3b - Trakční vedení, VCH-Rad	9 dny	24.08. 21	02.09. 21	EŽ
515	SO 02-67-02 - 3/3b - Ukolejnění, VCH-Rad	9 dny	24.08. 21	02.09. 21	EŽ
516	SO 91-31-51 - 3/3b - Výstroj a značení trati, Smí-Če	9 dny	24.08. 21	02.09. 21	STR
517	***Aktivace dočasného TZZ Velká Chuchle - Praha Radotín***	**1 den**	**01.09. 21**	**02.09. 21**	
518	PS 02-21-13 - 3/3b - TZZ, VCH-Rad	1 den	01.09. 21	02.09. 21	STR/AŽD
519	**4/4a - Rekonstrukce koleje 1 Závodiště - Praha-Radotín**	**96 dny**	**09.09. 21**	**14.12. 21**	
520	Uzavírka MK Radkovská - Radotínská	81 dny	14.09. 21	04.12. 21	
521	PS 02-21-13 - 4/4a - TZZ, VCH-Rad	96 dny	09.09. 21	14.12. 21	STR/AŽD
522	PS 03-22-01 - 4/4a - MK, ŽST Rad	96 dny	09.09. 21	14.12. 21	EUR/AŽD
523	PS 91-22-01 - 4/4a - DOK a TK, Smí-Če	96 dny	09.09. 21	14.12. 21	EUR/AŽD
524	SO 02-31-15 - 4/4a - Žel. spodek, lichá skupina, VCH-Rad	81 dny	14.09. 21	04.12. 21	EUR
525	SO 02-66-05 - 4/4a - Úprava přípojky NN, hradlo Závodiště	96 dny	09.09. 21	14.12. 21	EUR/EL
526	SO 91-61-51 - 4/4a - Převěšení závěsného optického kabelu SŽDC, Smí-Če	96 dny	09.09. 21	14.12. 21	EŽ
527	***Demontáž svršku a trakce kolejí 1 + 3 (odbočka Barrandov - Praha-Radotín/odbočka Tunel - Praha-Radotín)***	**4 dny**	**09.09. 21**	**13.09. 21**	
528	SO 02-31-05 - 4/4a - Žel. svršek, lichá skupina, VCH-Rad	4 dny	09.09. 21	13.09. 21	GJW
529	SO 91-31-51 - 4/4a - Výstroj a značení trati, Smí-Če	4 dny	09.09. 21	13.09. 21	STR
530	***Rekonstrukce mostu v km 8,415 a propustků v km 7,416+7,598+7,791+7,987 (lichá část)***	**81 dny**	**14.09. 21**	**04.12. 21**	
531	SO 02-34-07 - 4/4a - Žel. most v km 8,415	81 dny	14.09. 21	04.12. 21	EUR/MTS
532	SO 02-34-40 - 4/4a - Žel. propustek v km 7,416	81 dny	14.09. 21	04.12. 21	EUR
533	SO 02-34-41 - 4/4a - Žel. propustek v km 7,598	81 dny	14.09. 21	04.12. 21	EUR
534	SO 02-34-42 - 4/4a - Žel. propustek v km 7,791	81 dny	14.09. 21	04.12. 21	EUR
535	SO 02-34-43 - 4/4a - Žel. propustek v km 7,987	81 dny	14.09. 21	04.12. 21	EUR
536	***Základy TV + podpěry TV koleje 1, 3***	**49 dny**	**14.09. 21**	**02.11. 21**	
537	SO 02-61-02 - 4/4a - Trakční vedení, VCH-Rad	49 dny	14.09. 21	02.11. 21	EŽ
538	***Svršek + trakce kolejí 1, 3 Závodiště - Praha-Radotín***	**9 dny**	**05.12. 21**	**14.12. 21**	
539	SO 02-31-05 - 4/4a - Žel. svršek, lichá skupina, VCH-Rad	9 dny	05.12. 21	14.12. 21	GJW
540	SO 02-61-02 - 4/4a - Trakční vedení, VCH-Rad	9 dny	05.12. 21	14.12. 21	EŽ
541	SO 02-67-02 - 4/4a - Ukolejnění, VCH-Rad	9 dny	05.12. 21	14.12. 21	EŽ
542	SO 91-31-51 - 4/4a - Výstroj a značení trati, Smí-Če	9 dny	05.12. 21	14.12. 21	STR
543	***Aktivace dočasného TZZ Velká Chuchle - Praha Radotín***	**1 den**	**13.12. 21**	**14.12. 21**	
544	PS 02-21-13 - 4/4a - TZZ, VCH-Rad	1 den	13.12. 21	14.12. 21	STR/AŽD
545	zimní přestávka	54 dny	15.12. 21	07.02. 22	
546	**4/4c - Práce v liché skupině žst. Praha-Radotín**	**6 dny**	08.02. 22	14.02. 22	
547	**Praha-Radotín**	**1012 dny**	**12.08. 19**	**20.05. 22**	
548	**P - Přípravné práce**	**220 dny**	**12.08. 19**	**19.03. 20**	
549	PS 03-22-01 - P - MK, ŽST Rad	220 dny	12.08. 19	19.03. 20	EUR/AŽD
550	PS 03-22-02 - P - Úprava DK, ŽST Rad	220 dny	12.08. 19	19.03. 20	EUR/AŽD
551	PS 03-22-13 - P - EZS, ŽST Rad	220 dny	12.08. 19	19.03. 20	EUR/AŽD
552	PS 91-22-02 -P - Přenosový systém, Smí-Če	220 dny	12.08. 19	19.03. 20	EUR/AŽD
553	PS 91-22-31 - P - TRS a MRS, Smí-Če	220 dny	12.08. 19	19.03. 20	EUR/AŽD
554	SO 03-61-01 - P - Trakční vedení, ŽST Rad	91 dny	19.12. 19	19.03. 20	EŽ
555	SO 03-61-02 - P - Netypové brány trakčního vedení, ŽST Rad	78 dny	01.01. 20	19.03. 20	EŽ
556	SO 03-64-01 - P - Elektrický ohřev výměn, ŽST Rad	220 dny	12.08. 19	19.03. 20	EUR/EL
557	SO 02-66-63 - P - Dálkové ovládání odpojovačů, ŽST Rad	220 dny	12.08. 19	19.03. 20	EUR/EL
558	SO 03-66-01 - P - Rozvod NN a osvětlení, ŽST Rad	220 dny	12.08. 19	19.03. 20	EUR/EL
559	***Dočasné SZZ žst. Praha-Radotín (DSPŘ + výroba + testy + instalace)***	**220 dny**	**12.08. 19**	**19.03. 20**	

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Zhotovitel
560	PS 03-21-02 - P - SZZ, ŽST Rad	220 dny	12.08. 19	19.03. 20	EUR/AŽD
561	PS 04-21-14 - P - TZZ Rad-Če	220 dny	12.08. 19	19.03. 20	STR/AŽD
562	PS 91-22-01 - P - DOK a TK, Smí-Če	220 dny	12.08. 19	19.03. 20	EUR/AŽD
563	**Přístupy, plochy ZS, vytýčení IS**	220 dny	12.08. 19	19.03. 20	
564	***Přeložky sítí pod mostem v km 10,113***	**25 dny**	**09.02. 20**	**05.03. 20**	
565	SO 03-35-06 - P - Úprava VO v km 10,113	25 dny	09.02. 20	05.03. 20	EUR/EL
566	SO 03-35-07 - P - Úprava rozvodu NN 0,4kV PREDi v km 10,113	25 dny	09.02. 20	05.03. 20	EUR/EL
567	SO 03-35-24 - P - Úprava a ochrana sdělovacích kabelů T-MOBILE	25 dny	09.02. 20	05.03. 20	EUR/EL
568	SO 03-35-25 - P - Úprava ovladacího kabule TSK v km 10,113	25 dny	09.02. 20	05.03. 20	EUR/EL
569	SO 03-35-26.1 - P - Úprava kabelů UPC v km 10,113	25 dny	09.02. 20	05.03. 20	EUR/EL
570	SO 03-35-27 - P - Úprava rozvodů veřejného rozhlasu, Rad	25 dny	09.02. 20	05.03. 20	EUR/EL
571	***Kácení***	**143 dny**	**28.10. 19**	**19.03. 20**	
572	SO 91-71-01 - P - Odstranění mimolesní zeleně, Smí-Če	143 dny	28.10. 19	19.03. 20	EUR
573	Doplnění/pokračování na provizorním stavu PS 04-21-14	104 dny	01.04. 20	14.07. 20	STR/AŽD
574	Doplnění/pokračování na provizorním stavu PS 03-21-02	104 dny	01.04. 20	14.07. 20	EUR/AŽD
575	**0/0a - Přeložky sítí pod mostem v km 10,113**	**13 dny**	**06.03. 20**	**19.03. 20**	
576	Uzavírka silnice II/101 (Karlická)	13 dny	06.03. 20	19.03. 20	
577	SO 03-66-01 - 0/0a - Rozvod NN a osvětlení, ŽST Rad	13 dny	06.03. 20	19.03. 20	EUR/EL
578	***Přeložky sítí pod mostem v km 10,113***	**13 dny**	**06.03. 20**	**19.03. 20**	
579	SO 03-35-06 - 0/0a - Úprava VO v km 10,113	13 dny	06.03. 20	19.03. 20	EUR/EL
580	SO 03-35-07 - 0/0a - Úprava rozvodu NN 0,4kV PREDi v km 10,113	13 dny	06.03. 20	19.03. 20	EUR/EL
581	SO 03-35-24 - 0/0a - Úprava a ochrana sdělovacích kabelů T-MOBILE	13 dny	06.03. 20	19.03. 20	EUR/EL
582	SO 03-35-25 - 0/0a - Úprava ovladacího kabule TSK v km 10,113	13 dny	06.03. 20	19.03. 20	EUR/EL
583	SO 03-35-26.1 - 0/0a - Úprava kabelů UPC v km 10,113	13 dny	06.03. 20	19.03. 20	EUR/EL
584	SO 03-35-27 - 0/0a - Úprava rozvodů veřejného rozhlasu, Rad	13 dny	06.03. 20	19.03. 20	EUR/EL
585	***Aktivace dočasného SZZ žst. Praha-Radotín***	**9 dny**	**27.06. 20**	**06.07. 20**	
586	PS 03-21-02 - 0/0a - SZZ, ŽST Rad	9 dny	27.06. 20	06.07. 20	EUR/AŽD
587	PS 04-21-14 - 0/0a - TZZ Rad-Če	9 dny	27.06. 20	06.07. 20	STR/AŽD
588	**0/0b.1 - Příprava dobřichovického zhlaví na rekonstrukci mostu v km 10,113**	**10 dny**	**20.03. 20**	**30.03. 20**	
589	Uzavírka silnice II/101 (Karlická)	3 dny	20.03. 20	23.03. 20	
590	Uzavírka podchodu v km 10,221	3 dny	20.03. 20	23.03. 20	
591	**Výměna elektrického dělení na dobřichovickém zhlaví**	**10 dny**	**20.03. 20**	**30.03. 20**	
592	SO 03-61-01 - 0/0b.1 - Trakční vedení, ŽST Rad	10 dny	20.03. 20	30.03. 20	EŽ
593	SO 03-35-03 - Úprava rozvodu VN 22kV PREDi v km 10,025	213 dny	01.01. 20	01.08. 20	EUR/EL
594	SO 03-55-01 - Demolice objektů SŽDC, ŽST Rad, demolice TO	29 dny	01.02. 20	01.03. 20	STR
595	SO 03-55-01 - Demolice objektů SŽDC, ŽST Rad, demolice trafostanice	40 dny	15.02. 22	27.03. 22	STR
596	SO 62-36-61 - Přeložka plynovodu PPO STAHL	30 dny	01.08. 21	31.08. 21	STR
597	SO 03-51-01 - Stavební úpravy ve VB, ŽST Rad	121 dny	01.04. 21	31.07. 21	STR
598	Uzavírka silnice II/101 (Karlická)	36 dny	09.03. 20	14.04. 20	
599	**1 - Rekonstrukce mostů v km 10,113 (sudá část)**	**129 dny**	**14.04. 20**	**21.08. 20**	
600	Uzavírka silnice II/101 (Karlická)	129 dny	14.04. 20	21.08. 20	
601	Uzavírka podchodu v km 10,221	129 dny	14.04. 20	21.08. 20	
602	PS 03-21-02 - 1 - SZZ, ŽST Rad	129 dny	14.04. 20	21.08. 20	EUR/AŽD
603	PS 03-22-01 - 1 - MK, ŽST Rad	129 dny	14.04. 20	21.08. 20	EUR/AŽD
604	PS 03-22-15 - 1 - Sdělovací zařízení, ŽST Rad	129 dny	14.04. 20	21.08. 20	EUR/AŽD
605	SO 03-34-53 - 1 - Opěrná zeď v km 10,1 - 10,3, ŽST Rad	129 dny	14.04. 20	21.08. 20	STR
606	***Demolice sudé části stávajícího mostu v km 10,113***	**19 dny**	**14.04. 20**	**03.05. 20**	
607	SO 03-34-03 - 1 - Žel. most v km 10,113	19 dny	14.04. 20	03.05. 20	STR/MTS
608	***Stavba sudé části nového mostu v km 10,113***	**94 dny**	**04.05. 20**	**06.08. 20**	
609	SO 03-34-03 - 1 - Žel. most v km 10,113	94 dny	04.05. 20	06.08. 20	STR/MTS
610	***Podchod v km 10,221 (část pod budoucí kolejí 4)***	**124 dny**	**14.04. 20**	**16.08. 20**	
611	SO 03-34-23 - 1 - Žel. podchod v km 10,221, ŽST Rad	124 dny	14.04. 20	16.08. 20	STR/MTS
612	**Vložení definitivních výhybek 29X + 30X včetně úprav TV (realizace: sudá část 1.-7.7.20 a lichá část 8.-14.7.20)**	**15 dny**	**01.07. 20**	**16.07. 20**	
613	PS 03-21-02 - 1 - SZZ, ŽST Rad	15 dny	01.07. 20	16.07. 20	EUR/AŽD
614	PS 03-22-01 - 1 - MK, ŽST Rad	15 dny	01.07. 20	16.07. 20	EUR/AŽD
615	PS 03-22-15 - 1 - Sdělovací zařízení, ŽST Rad	15 dny	01.07. 20	16.07. 20	EUR/AŽD
616	SO 03-66-01 - 1 - Rozvod NN a osvětlení, ŽST Rad	15 dny	01.07. 20	16.07. 20	EUR/EL
617	SO 03-31-01 - 1 - Žel. svršek, lichá skupina, ŽST Rad	15 dny	01.07. 20	16.07. 20	GJW
618	SO 03-31-02 - 1 - Žel. svršek, sudá skupina, ŽST Rad	15 dny	01.07. 20	16.07. 20	STR
619	SO 03-31-11 - 1 - Žel. spodek, lichá skupina, ŽST Rad	15 dny	01.07. 20	16.07. 20	STR/GJW
620	SO 03-31-12 - 1 - Žel. spodek, sudá skupina, ŽST Rad	15 dny	01.07. 20	16.07. 20	STR
621	SO 03-61-01 - 1 - Trakční vedení, ŽST Rad	15 dny	01.07. 20	16.07. 20	EŽ
622	SO 91-31-51 - 1 - Výstroj a značení trati, Smí-Če	15 dny	01.07. 20	16.07. 20	STR
623	**Demontáž koleje 2 v úseku výhybka 27 stávající včetně - výhybka 29 stávající včetně**	**15 dny**	**01.07. 20**	**16.07. 20**	
624	SO 03-31-02 - 1 - Žel. svršek, sudá skupina, ŽST Rad	15 dny	01.07. 20	16.07. 20	STR
625	SO 91-31-51 - 1 - Výstroj a značení trati, Smí-Če	15 dny	01.07. 20	16.07. 20	STR
626	***Aktivace dočasného SZZ žst. Praha-Radotín***	**15 dny**	**01.07. 20**	**16.07. 20**	
627	PS 03-21-02 - 0/0b - SZZ, ŽST Rad	15 dny	01.07. 20	16.07. 20	EUR/AŽD
628	***Svršek koleje 2 mezi výhybkami 27 a 31 mimo, úpravy TV***	**4 dny**	**17.08. 20**	**21.08. 20**	
629	SO 03-31-02 - 1 - Žel. svršek, sudá skupina, ŽST Rad	4 dny	17.08. 20	21.08. 20	STR
630	SO 03-31-12 - 1 - Žel. spodek, sudá skupina, ŽST Rad	4 dny	17.08. 20	21.08. 20	STR
631	SO 03-61-01 - 1 - Trakční vedení, ŽST Rad	4 dny	17.08. 20	21.08. 20	EŽ
632	SO 03-67-01 - 1 - Ukolenění, ŽST Rad	4 dny	17.08. 20	21.08. 20	EŽ
633	SO 91-31-51 - 1 - Výstroj a značení trati, Smí-Če	4 dny	17.08. 20	21.08. 20	STR
634	SO 03-55-02 - Demolice objektů ČD, ŽST Rad	233 dny	01.01. 20	21.08. 20	STR
635	SO 03-36-11 - Přeložka vodovodu v km 9,371	111 dny	10.12. 20	31.03. 21	STR
636	SO 03-36-61 - Přeložka plynovodu v km 9,373	111 dny	10.12. 20	31.03. 21	STR
637	**2 - Rekonstrukce mostů v km 10,113 (lichá část)**	**209 dny**	**22.08. 20**	**19.03. 21**	
638	Kolej 1 konec nástupiště - výhybka 30X mimo	209 dny	22.08. 20	19.03. 21	
639	Uzavírka silnice II/101 (Karlická)	109 dny	22.08. 20	09.12. 20	
640	Uzavírka podchodu v km 10,221	209 dny	22.08. 20	19.03. 21	
641	Uzavírka Vrážské ulice (úsek U Jankovky - Matějovského), 8 hodin noc	0 dny	09.03. 21	09.03. 21	
642	Uzavírka ulice Na betonce	9 dny	30.11. 20	09.12. 20	
643	PS 03-21-02 - 2 - SZZ, ŽST Rad	203 dny	22.08. 20	13.03. 21	EUR/AŽD
644	PS 03-22-01 - 2 - MK, ŽST Rad	203 dny	22.08. 20	13.03. 21	EUR/AŽD
645	PS 03-22-15 - 2 - Sdělovací zařízení, ŽST Rad	203 dny	22.08. 20	13.03. 21	EUR/AŽD
646	SO 03-31-01 - 2 - Žel. svršek, lichá skupina, ŽST Rad	9 dny	30.11. 20	09.12. 20	GJW
647	SO 03-31-11 - 2 - Žel. spodek, lichá skupina, ŽST Rad	138 dny	27.08. 20	08.03. 21	STR/GJW
648	SO 03-34-53 - 2 - Opěrná zeď v km 10,1 - 10,3, ŽST Rad	203 dny	22.08. 20	13.03. 21	STR
649	SO 03-35-06 - 2 - Úprava VO v km 10,113	109 dny	22.08. 20	09.12. 20	EUR/EL
650	SO 03-35-07 - 2 - Úprava rozvodu NN 0,4kV PREDi v km 10,113	109 dny	22.08. 20	09.12. 20	EUR/EL
651	SO 03-35-27 - 2 - Úprava rozvodů veřejného rozhlasu, Rad	109 dny	22.08. 20	09.12. 20	EUR/EL
652	SO 03-35-24 - 2 - Úprava a ochrana sdělovacích kabelů T-MOBILE	109 dny	22.08. 20	09.12. 20	EUR/EL
653	SO 03-35-25 - 2 - Úprava ovladacího kabule TSK v km 10,113	109 dny	22.08. 20	09.12. 20	EUR/EL
654	SO 03-35-26.1 - 2 - Úprava kabelů UPC v km 10,113	109 dny	22.08. 20	09.12. 20	EUR/EL
655	SO 03-36-33 - 2 - Úprava přípojky odvodnění v km 10,113	73 dny	22.08. 20	03.11. 20	STR
656	SO 03-40-01 - 2 - PHS, ulice Ke Zděři I, Rad	203 dny	22.08. 20	13.03. 21	STR
657	SO 03-51-03 - 2 - Domek pro měnič zab.zař.,ŽST Rad	181 dny	01.09. 20	01.03. 21	STR
658	SO 03-51-52 - Úprava oplocení areálu parkoviště v ulici Karlická	82 dny	09.12. 20	01.03. 21	STR
659	SO 03-66-01 - 2 - Rozvod NN a osvětlení, ŽST Rad	203 dny	22.08. 20	13.03. 21	EUR/EL
660	***Demontáž svršku koleje 1 žst. Praha-Radotín mezi zkráceným nástupištěm a výhybkou 30X, úpravy TV***	**4 dny**	**22.08. 20**	**26.08. 20**	
661	SO 03-31-01 - 2 - Žel. svršek, lichá skupina, ŽST Rad	4 dny	22.08. 20	26.08. 20	GJW
662	SO 03-61-01 - 2 - Trakční vedení, ŽST Rad	4 dny	22.08. 20	26.08. 20	EŽ
663	SO 91-31-51 - 2 - Výstroj a značení trati, Smí-Če	4 dny	22.08. 20	26.08. 20	STR
664	***Demolice části nástupiště u koleje 1***	**4 dny**	**22.08. 20**	**26.08. 20**	
665	SO 03-32-02 - 2 - Nástupiště č.2, ŽST Rad	4 dny	22.08. 20	26.08. 20	GJW
666	***Demolice liché části stávajícího mostu 10,113***	**9 dny**	**27.08. 20**	**05.09. 20**	
667	SO 03-34-03 - 2 - Žel. most v km 10,113	9 dny	27.08. 20	05.09. 20	STR/MTS
668	***Stavba liché části nového mostu v km 10,113 (hrubá)***	**94 dny**	**06.09. 20**	**09.12. 20**	
669	SO 03-34-03 - 2 - Žel. most v km 10,113	94 dny	06.09. 20	09.12. 20	STR/MTS
670	***Podchod v km 10,221 (část pod budoucí kolejí 4)***	**109 dny**	**22.08. 20**	**09.12. 20**	
671	SO 03-34-23 - 2 - Žel. podchod v km 10,221, ŽST Rad	109 dny	22.08. 20	09.12. 20	STR/MTS
672	**Most v km 9,950 (lichá část mimo kolejiště)**	**59 dny**	**27.08. 20**	**25.10. 20**	
673	SO 03-34-22 - 2 - Žel. podchod v km 9,950, ŽST Rad	59 dny	27.08. 20	25.10. 20	STR

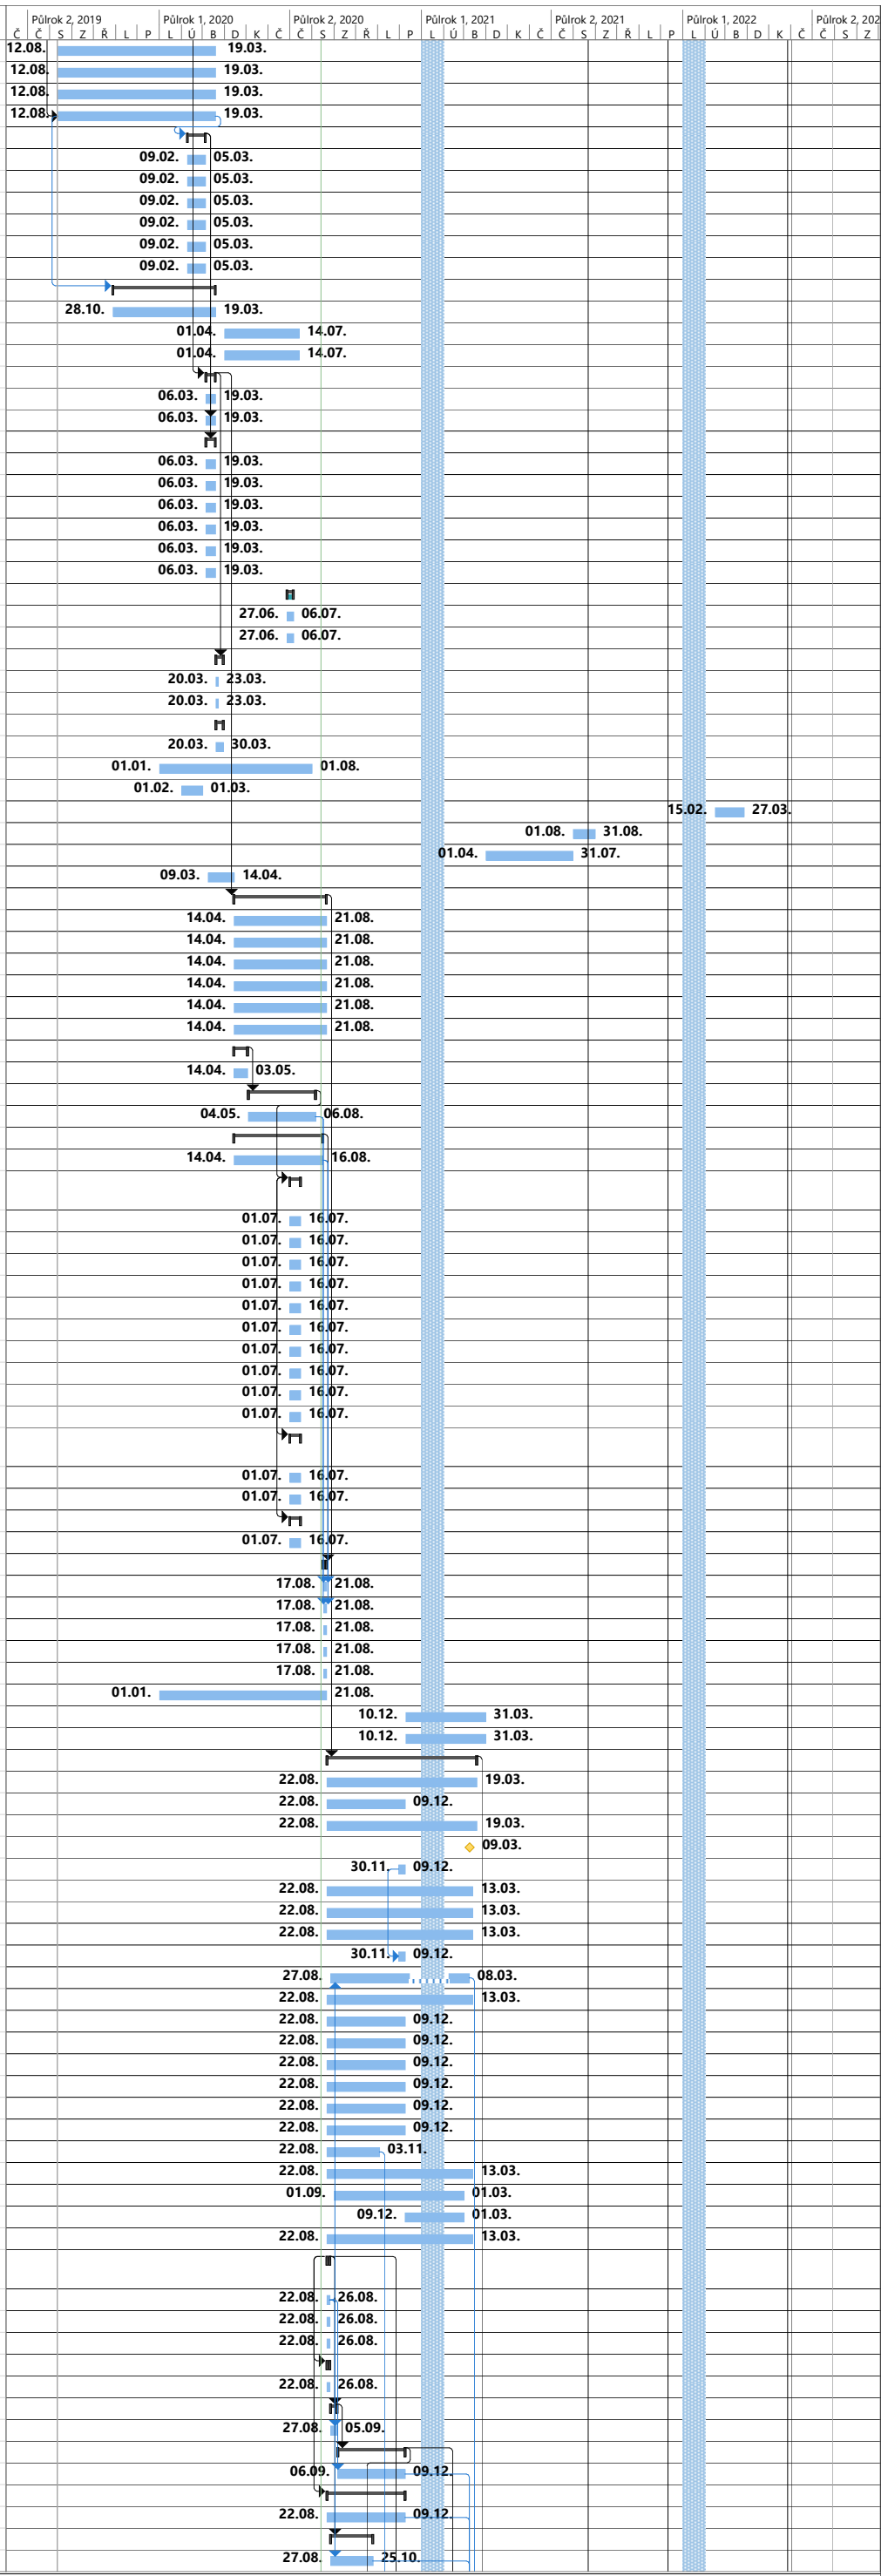

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Zhotovitel
674	***Komunikace Karlická, definitivní konstrukce***	**35 dny**	**04.11. 20**	**09.12. 20**	
675	SO 03-38-03 - 2 - Úprava komunikace pod mostem v km 10,113	35 dny	04.11. 20	09.12. 20	STR
676	**Stavba liché části nového mostu v km 10,113 (isolace, dokončení)**	**19 dny**	**17.02. 21**	**08.03. 21**	
677	SO 03-34-03 - 2 - Žel. most v km 10,113	19 dny	17.02. 21	08.03. 21	STR/MTS
678	***Svršek liché skupiny v prostoru rekonstruovaného mostu, úpravy TV***	**4 dny**	**09.03. 21**	**13.03. 21**	
679	SO 03-31-01 - 2 - Žel. svršek, lichá skupina, ŽST Rad	4 dny	09.03. 21	13.03. 21	GJW
680	SO 03-61-01 - 2 - Trakční vedení, ŽST Rad	4 dny	09.03. 21	13.03. 21	EŽ
681	SO 03-67-01 - 2 - Ukolenění, ŽST Rad	4 dny	09.03. 21	13.03. 21	EŽ
682	SO 91-31-51 - 2 - Výstroj a značení trati, Smí-Če	4 dny	09.03. 21	13.03. 21	STR
683	***Dočasná lávka pro pěší přes kolejiště žst.: stavba podpěrné věže na ostrovním nástupišti***	**9 dny**	**30.11. 20**	**09.12. 20**	
684	SO 03-34-21.2 - 2 - Provizorní lávka, ŽST Rad	9 dny	30.11. 20	09.12. 20	STR/MTS
685	***Dočasná lávka pro pěší přes kolejiště žst.: stavba schodišťových a podpěrných věží (u výpravní budovy a u parkoviště)***	**9 dny**	**27.02. 21**	**08.03. 21**	
686	SO 03-34-21.2 - 2 - Provizorní lávka, ŽST Rad	9 dny	27.02. 21	08.03. 21	STR/MTS
687	***Dočasná lávka pro pěší přes kolejiště žst.: sestavení nosných konstrukcí***	**29 dny**	**07.02. 21**	**08.03. 21**	
688	SO 03-34-21.2 - 2 - Provizorní lávka, ŽST Rad	29 dny	07.02. 21	08.03. 21	STR/MTS
689	***Dočasná lávka pro pěší přes kolejiště žst.: osazení nosné konstrukce přes koleje 1, 2, 3 na podpěrné věže***	**0 dny**	**09.03. 21**	**09.03. 21**	
690	SO 03-34-21.2 - 2 - Provizorní lávka, ŽST Rad	0 dny	09.03. 21	09.03. 21	STR/MTS
691	***Dočasná lávka pro pěší přes kolejiště žst.: osazení nosné konstrukce přes koleje 4 - 10 na podpěrné věže***	**0 dny**	**14.03. 21**	**14.03. 21**	
692	SO 03-34-21.2 - 2 - Provizorní lávka, ŽST Rad	0 dny	14.03. 21	14.03. 21	STR/MTS
693	***Dočasná lávka pro pěší přes kolejiště žst.: dokončovací práce, montáž osvětlení, přístupové komunikace***	**9 dny**	**10.03. 21**	**19.03. 21**	
694	SO 03-34-21.2 - 2 - Provizorní lávka, ŽST Rad	9 dny	10.03. 21	19.03. 21	STR/MTS
695	**3/3a - Rekonstrukce sudé skupiny (1.část)**	**1 den**	**20.03. 21**	**21.03. 21**	
696	Uzavírka podchodu v km 10,221	1 den	20.03. 21	21.03. 21	
697	PS 03-21-02 - 3/3a - SZZ, ŽST Rad	1 den	20.03. 21	21.03. 21	EUR/AŽD
698	PS 03-22-01 - 3/3a - MK, ŽST Rad	1 den	20.03. 21	21.03. 21	EUR/AŽD
699	PS 03-22-15 - 3/3a - Sdělovací zařízení, ŽST Rad	1 den	20.03. 21	21.03. 21	EUR/AŽD
700	***Demontáž svršku koleje 2 žst. Praha-Radotín mezi výhybkami 27 mimo a 31 včetně, napojení výhybky 26X na kolej 2, dočasné úpravy TV***	**1 den**	**20.03. 21**	**21.03. 21**	
701	SO 03-31-02 - 3/3a - Žel. svršek, sudá skupina, ŽST Rad	1 den	20.03. 21	21.03. 21	STR
702	SO 03-31-12 - 3/3a - Žel. spodek, sudá skupina, ŽST Rad	1 den	20.03. 21	21.03. 21	STR
703	SO 91-31-51 - 3/3a - Výstroj a značení trati, Smí-Če	1 den	20.03. 21	21.03. 21	STR
704	SO 03-35-02 - Úprava napojení VN 22kV PREDi, transformovna 22/0,4kV, Rad	587 dny	01.01. 20	10.08. 21	EUR/EL
705	SO 03-35-08 - Úprava VO v km 10,234	178 dny	01.03. 21	26.08. 21	EUR/EL
706	**3/3b - Rekonstrukce sudé skupiny (1.část)**	**144 dny**	**22.03. 21**	**13.08. 21**	
707	Uzavírka MK Prvomájová	139 dny	27.03. 21	13.08. 21	
708	Uzavírka přístupu do podchodu od ulice Prvomájová	89 dny	27.03. 21	24.06. 21	
709	Uzavírka ulice Na betonce	14 dny	14.07. 21	28.07. 21	
710	uzavírka podchodu v km 10,221	144 dny	22.03. 21	13.08. 21	
711	PS 02-23-71 - 3/3b - Měnič pro napájení ZZ, ŽST Rad	144 dny	22.03. 21	13.08. 21	EUR/EL
712	PS 02-23-72 - 3/3b - Rozvaděč zajištěné sítě, ŽST Rad	144 dny	22.03. 21	13.08. 21	EUR/EL
713	PS 03-21-02 - 3/3b - SZZ, ŽST Rad	144 dny	22.03. 21	13.08. 21	EUR/AŽD
714	PS 03-22-01 - 3/3b - MK, ŽST Rad	144 dny	22.03. 21	13.08. 21	EUR/AŽD
715	PS 03-22-15 - 3/3b - Sdělovací zařízení, ŽST Rad	144 dny	22.03. 21	13.08. 21	EUR/AŽD
716	PS 03-22-21 - 3/3b - Rozhlasové zařízení, ŽST Rad	144 dny	22.03. 21	13.08. 21	EUR/AŽD
717	PS 03-22-13 - 3/3b - EZS, odbočka VCH	144 dny	22.03. 21	13.08. 21	EUR/AŽD
718	PS 03-22-14 - 3/3b - ASHS, ŽST Rad	144 dny	22.03. 21	13.08. 21	EUR/AŽD
719	PS 03-22-23 - 3/3b - Kamerový systém, ŽST Rad	144 dny	22.03. 21	13.08. 21	EUR/AŽD
720	PS 03-22-02 - 3/3b - Úprava DK, ŽST Rad	144 dny	22.03. 21	13.08. 21	EUR/AŽD
721	PS 03-22-22 - 3/3b - Informační zařízení, ŽST Rad	144 dny	22.03. 21	13.08. 21	EUR/EL
722	PS 03-22-11 - 3/3b - Telefonní zapojovač, ŽST Rad	144 dny	22.03. 21	13.08. 21	EUR/AŽD
723	PS 03-22-12 - 3/3b - Úprava ATÚ, ŽST Rad	144 dny	22.03. 21	13.08. 21	EUR/AŽD
724	PS 03-23-01 - 3/3b - DŘT, ŽST Rad	144 dny	22.03. 21	13.08. 21	EŽ
725	PS 03-23-44 - 3/3b - Technologie-část SŽDC, transformovna 22/0,4 Kv, ŽST Rad	144 dny	22.03. 21	13.08. 21	EUR/EL
726	PS 03-23-45 - 3/3b - Vlastní spotřeba, transformovna 22/0,4 Kv, ŽST Rad	144 dny	22.03. 21	13.08. 21	EUR/EL
727	PS 03-23-46 - 3/3b - Demontáž technologie, transformovna 22/0,4 Kv, ŽST Rad	144 dny	22.03. 21	13.08. 21	EUR/EL
728	PS 03-24-01 - 3/3b - Výtahy I, ŽST Rad	144 dny	22.03. 21	13.08. 21	EUR
729	PS 03-24-02 - 3/3b - Výtahy II, ŽST Rad	144 dny	22.03. 21	13.08. 21	EUR
730	PS 91-22-02 - 3/3b - Přenosový systém, Smí-Če	144 dny	22.03. 21	13.08. 21	EUR/AŽD
731	PS 92-23-01 - 3/3b - Doplnění DŘT, ED Křenovka	144 dny	22.03. 21	13.08. 21	EŽ
732	SO 03-31-12 - 3/3b - Žel. spodek, sudá skupina, ŽST Rad	108 dny	27.03. 21	13.07. 21	STR
733	SO 03-35-01 - 3/3b - Úprava VO v km 9,393	136 dny	27.03. 21	10.08. 21	EUR/EL
734	SO 03-35-26 - 3/3b - Úprava zařízení UPC ve VB	144 dny	22.03. 21	13.08. 21	EUR/EL
735	SO 03-36-32 - 3/3b - Děšťová kanalizace, ŽST Rad	144 dny	22.03. 21	13.08. 21	STR
736	SO 03-39-10 - 3/3b - Kabelovod, ŽST Rad	144 dny	22.03. 21	13.08. 21	EUR
737	SO 03-40-51 - 3/3b - PHS, ulice Prvomájová, Rad	144 dny	22.03. 21	13.08. 21	STR
738	SO 03-40-52 - 3/3b - PHS, Centrum Radotín	144 dny	22.03. 21	13.08. 21	STR
739	SO 03-51-51 - 3/3b - Oplocení, ŽST Rad	144 dny	22.03. 21	13.08. 21	STR
740	SO 03-64-01 - 3/3b- Elektrický ohřev výměn, ŽST Rad	144 dny	22.03. 21	13.08. 21	EUR/EL
741	SO 03-66-01 - 3/3b - Rozvod NN a osvětlení, ŽST Rad	144 dny	22.03. 21	13.08. 21	EUR/EL
742	SO 02-66-63 - 3/3b - Dálkové ovládání odpojovačů, ŽST Rad	144 dny	22.03. 21	13.08. 21	EUR/EL
743	***Demontáž svršku a trakce sudé skupiny (výhybky 3, 5, 7, 9B, 9A, 10B, 10A, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24ab, 25, 27, 29, koleje 2, 4, 6, 6a, 6c, 8, 10, 12a)***	**4 dny**	**22.03. 21**	**26.03. 21**	
744	SO 03-31-02 - 3/3b - Žel. svršek, sudá skupina, ŽST Rad	4 dny	22.03. 21	26.03. 21	STR
745	SO 91-31-51 - 3/3b - Výstroj a značení trati, Smí-Če	4 dny	22.03. 21	26.03. 21	STR
746	***Demolice nástupiště 2 včetně zastřešení***	**14 dny**	**22.03. 21**	**05.04. 21**	
747	SO 03-32-03 - 3/3b - Nástupiště č.3, ŽST Rad	14 dny	22.03. 21	05.04. 21	STR
748	SO 03-52-02 - 3/3b - Zastřešení nástupiště č.2, ŽST Rad	14 dny	22.03. 21	05.04. 21	STR
749	**Rekonstrukce zdi v km 8,6 - 9,1 (horní části včetně kotev TV)**	**59 dny**	**27.03. 21**	**25.05. 21**	
750	SO 03-34-51 - 3/3b - Zárubní zeď v km 8,6 - 9,1, ŽST Rad	59 dny	27.03. 21	25.05. 21	EUR
751	SO 03-61-01 - 3/3b - Trakční vedení, ŽST Rad	59 dny	27.03. 21	25.05. 21	EŽ
752	***Rekonstrukce propustků v km 8,761 + 9,050 (sudá část)***	**39 dny**	**27.03. 21**	**05.05. 21**	
753	SO 03-34-31 - 3/3b - Žel. propustek v km 8,761	39 dny	27.03. 21	05.05. 21	EUR
754	SO 03-34-32 - 3/3b - Žel. propustek v km 9,050	39 dny	27.03. 21	05.05. 21	EUR
755	***Rekonstrukce mostu v km 9,393 (sudá část)***	**109 dny**	**27.03. 21**	**14.07. 21**	
756	SO 03-34-01 - 3/3b - Žel. most v km 9,393	109 dny	27.03. 21	14.07. 21	EUR/MTS
757	**Rekonstrukce mostu v km 9,764 (sudá část)**	**89 dny**	**27.03. 21**	**24.06. 21**	
758	SO 03-34-21 - 3/3b - Žel. podchod v km 9,764, ŽST Rad	89 dny	27.03. 21	24.06. 21	EUR
759	SO 03-52-03 - 3/3b - Zastřešení výstupu z podchodu k ulici Prvomájová, ŽST Rad	89 dny	27.03. 21	24.06. 21	STR
760	***Most v km 9,950 (sudá část)***	**69 dny**	**27.03. 21**	**04.06. 21**	
761	SO 03-34-22 - 3/3b - Žel. podchod v km 9,950, ŽST Rad	69 dny	27.03. 21	04.06. 21	STR
762	SO 03-52-05 - 3/3b - Zastřešení výstupu z podchodu k ulici Na betonce, ŽST Rad	69 dny	27.03. 21	04.06. 21	STR
763	***Základy TV + podpěry TV sudá skupina žst. Praha-Radotín***	**69 dny**	**23.03. 21**	**31.05. 21**	
764	SO 03-61-01 - 3/3b - Trakční vedení, ŽST Rad	69 dny	23.03. 21	31.05. 21	EŽ
765	SO 03-61-02 - 3/3b - Netypové brány trakčního vedení, ŽST Rad	69 dny	23.03. 21	31.05. 21	EŽ
766	***Nástupiště 3 včetně zastřešení***	**29 dny**	**25.06. 21**	**24.07. 21**	
767	SO 03-32-03 - 3/3b - Nástupiště č.3, ŽST Rad	29 dny	25.06. 21	24.07. 21	STR
768	SO 03-52-02 - 3/3b - Zastřešení nástupiště č.2, ŽST Rad	29 dny	25.06. 21	24.07. 21	STR
769	SO 03-54-01 - 3/3b - Orientační systém, ŽST Rad	29 dny	25.06. 21	24.07. 21	STR
770	SO 03-54-02 - 3/3b - Orientační systém, ŽST Rad	29 dny	25.06. 21	24.07. 21	STR
771	SO 03-60-01 - 3/3b - Drobná architektura, ŽST Rad	29 dny	25.06. 21	24.07. 21	STR
772	***Dočasné nástupiště u koleje 8***	**4 dny**	**14.07. 21**	**18.07. 21**	
773	SO 03-32-03 - 3/3b - Nástupiště č.3, ŽST Rad	4 dny	14.07. 21	18.07. 21	STR
774	***Svršek sudé kolejové skupiny (výhybky 1X, 2X, 3X, 9X, 11X, 12X, 13X, 14X, 16X, 17X, 19X, 20X, 21X, 22X, 23X, 24X, 27X, 33P, koleje 2, 4, 4b, 6, 8, 8b, 10a)***	**29 dny**	**14.07. 21**	**12.08. 21**	
775	SO 03-31-02 - 3/3b - Žel. svršek, sudá skupina, ŽST Rad	29 dny	14.07. 21	12.08. 21	STR
776	SO 03-31-12 - 3/3b - Žel. spodek, sudá skupina, ŽST Rad	29 dny	14.07. 21	12.08. 21	STR
777	SO 91-31-51 - 3/3b - Výstroj a značení trati, Smí-Če	29 dny	14.07. 21	12.08. 21	STR
778	***TV sudé skupiny***	**29 dny**	**14.07. 21**	**12.08. 21**	

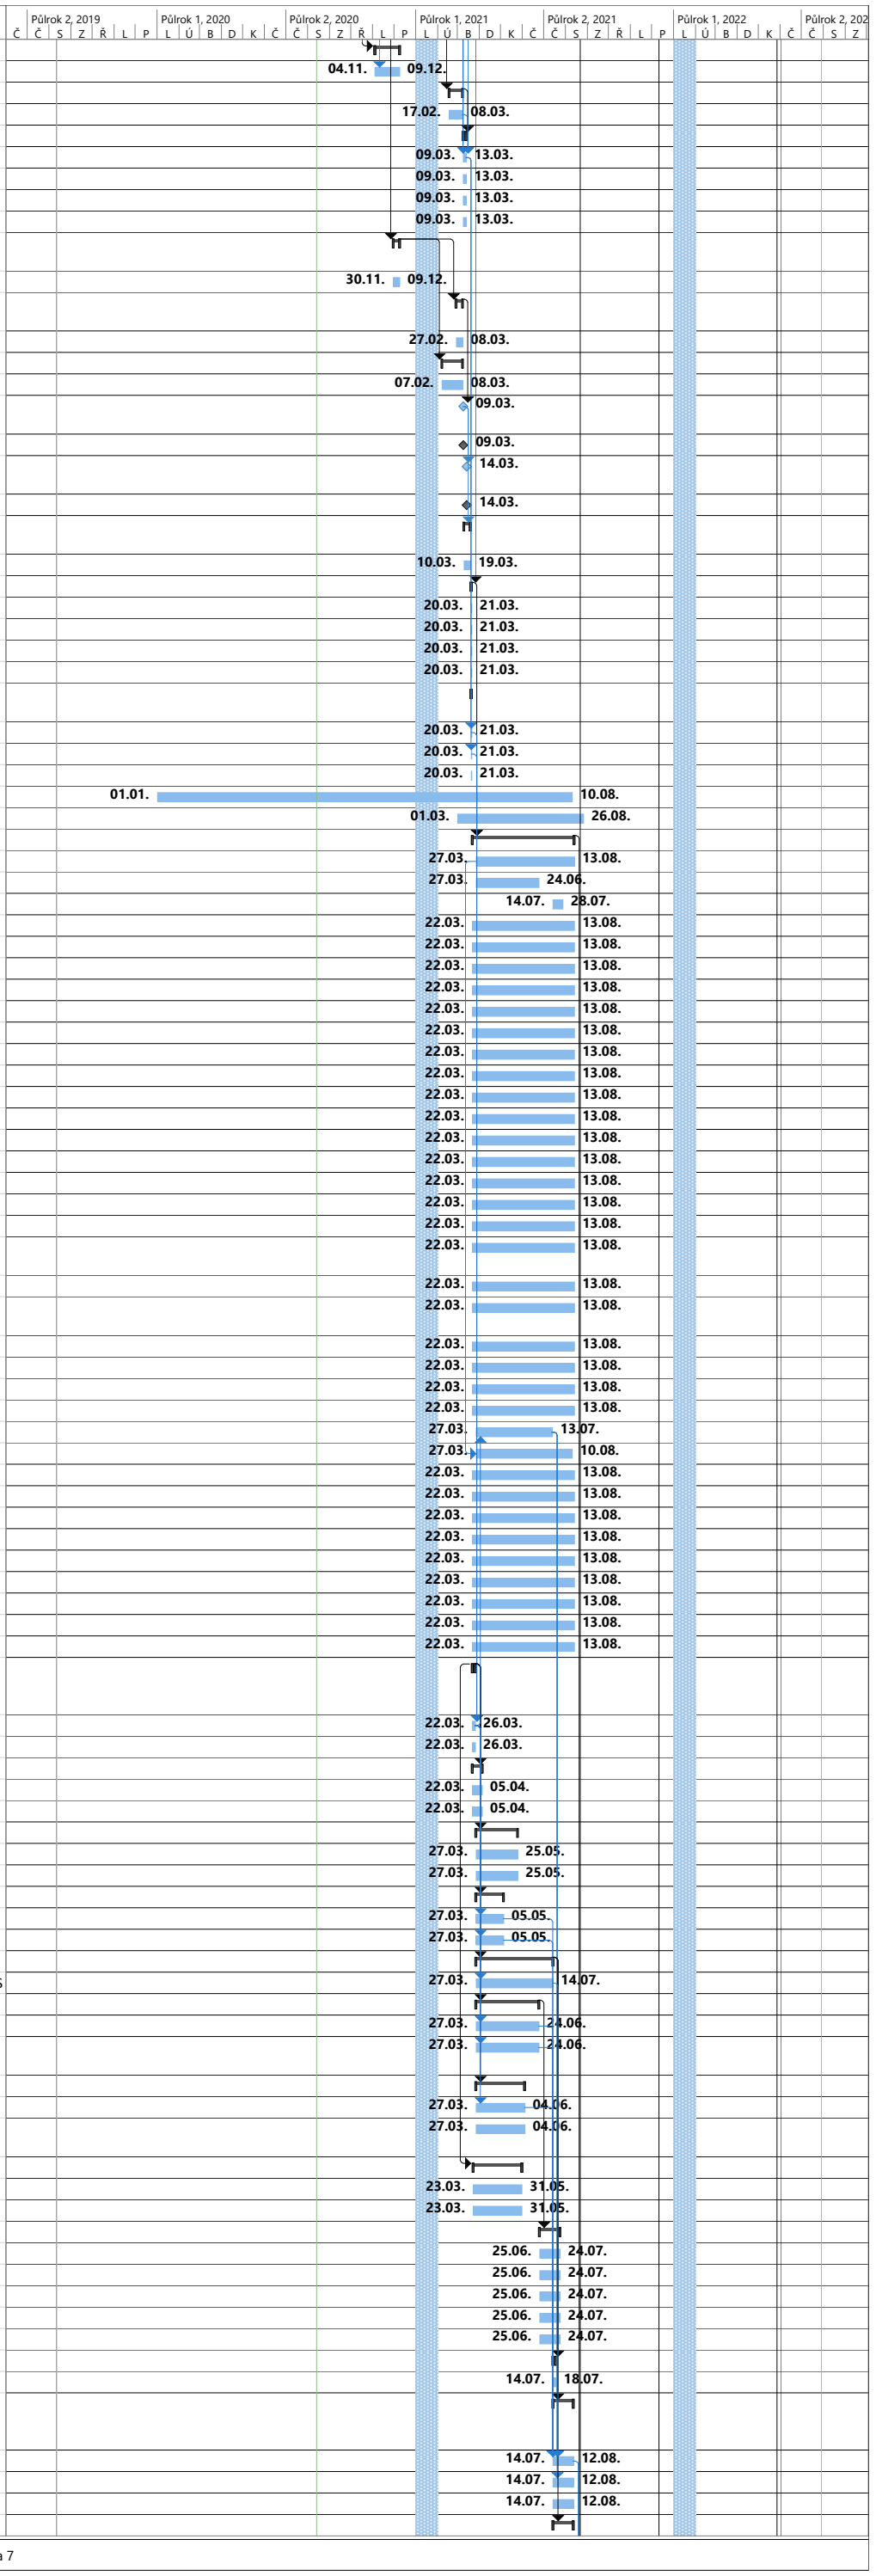

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Zhotovitel
779	SO 03-61-01 - 3/3b - Trakční vedení, ŽST Rad	29 dny	14.07. 21	12.08. 21	EŽ
780	SO 03-61-02 - 3/3b - Netypové brány trakčního vedení, ŽST Rad	29 dny	14.07. 21	12.08. 21	EŽ
781	SO 03-67-01 - 3/3b - Ukolenění, ŽST Rad	29 dny	14.07. 21	12.08. 21	EŽ
782	**A03 - Aktivace dočasného SZZ Praha-Radotín, sudá skupina**	**10 dny**	**13.08. 21**	**23.08. 21**	
783	PS 03-21-02 - A03 - SZZ, ŽST Rad	10 dny	13.08. 21	23.08. 21	EUR/AŽD
784	A03 - Uzavírka MK Prvomájová, možný průchod pěších	10 dny	13.08. 21	23.08. 21	
785	A03 - Uzavírka podchodu v km 10,221	10 dny	13.08. 21	23.08. 21	
786	**3/3c - Rekonstrukce sudé skupiny (2.část)**	**2 dny**	**24.08. 21**	**26.08. 21**	
787	Uzavírka MK Prvomájová, možný průchod pěších	2 dny	24.08. 21	26.08. 21	
788	Uzavírka podchodu v km 10,221	2 dny	24.08. 21	26.08. 21	
789	PS 03-21-01 - 3/3c - ZZ, vlečka cementárna	2 dny	24.08. 21	26.08. 21	STR/AŽD
790	PS 03-21-02 - 3/3c - SZZ, ŽST Rad	2 dny	24.08. 21	26.08. 21	EUR/AŽD
791	PS 03-22-01 - 3/3c - MK, ŽST Rad	2 dny	24.08. 21	26.08. 21	EUR/AŽD
792	PS 03-22-15 - 3/3c - Sdělovací zařízení, ŽST Rad	2 dny	24.08. 21	26.08. 21	EUR/AŽD
793	SO 03-31-03 - 3/3c - Žel. svršek, vlečka cementárna	2 dny	24.08. 21	26.08. 21	STR
794	SO 03-31-13 - 3/3c - Žel. spodek, vlečka cementárna	2 dny	24.08. 21	26.08. 21	STR
795	***Demontáž svršku spojek výhybka 26X mimo - výhybka 33 včetně***	**2 dny**	**24.08. 21**	**26.08. 21**	
796	SO 03-31-02 - 3/3c - Žel. svršek, sudá skupina, ŽST Rad	2 dny	24.08. 21	26.08. 21	STR
797	SO 03-31-12 - 3/3c - Žel. spodek, sudá skupina, ŽST Rad	2 dny	24.08. 21	26.08. 21	STR
798	SO 91-31-51 - 3/3c - Výstroj a značení trati, Smí-Če	2 dny	24.08. 21	26.08. 21	STR
799	***Vložení dočasné výhybky 33P včetně napojení na kolej 2 směr Dobřichovice***	**0 dny**	**26.08. 21**	**26.08. 21**	
800	SO 03-31-02 - 3/3c - Žel. svršek, sudá skupina, ŽST Rad	0 dny	26.08. 21	26.08. 21	STR
801	SO 91-31-51 - 3/3c - Výstroj a značení trati, Smí-Če	0 dny	26.08. 21	26.08. 21	STR
802	**4/4a - Rekonstrukce liché část propustku v km 8,761**	**151 dny**	**09.09. 21**	**07.02. 22**	
803	Uzavírka MK Prvomájová, možný průchod pěších	96 dny	09.09. 21	14.12. 21	
804	Uzavírka podchodu v km 10,221	96 dny	09.09. 21	14.12. 21	
805	PS 03-21-02 - 4/4a - SZZ, ŽST Rad	151 dny	09.09. 21	07.02. 22	EUR/AŽD
806	PS 03-22-01 - 4/4a - MK, ŽST Rad	151 dny	09.09. 21	07.02. 22	EUR/AŽD
807	PS 03-22-15 - 4/4a - Sdělovací zařízení, ŽST Rad	151 dny	09.09. 21	07.02. 22	EUR/AŽD
808	SO 03-31-11 - 4/4a - Žel. spodek, lichá skupina, ŽST Rad	81 dny	14.09. 21	04.12. 21	STR/GJW
809	***Demontáž svršku a trakce kolejí 1, 3 v úseku smíchovské záhlaví - výhybky 1/4 mimo***	**4 dny**	**09.09. 21**	**13.09. 21**	
810	SO 03-31-01 - 4/4a - Žel. svršek, lichá skupina, ŽST Rad	4 dny	09.09. 21	13.09. 21	GJW
811	SO 91-31-51 - 4/4a - Výstroj a značení trati, Smí-Če	4 dny	09.09. 21	13.09. 21	STR
812	***Rekonstrukce propustku v km 8,761 (lichá část)***	**29 dny**	**14.09. 21**	**13.10. 21**	
813	SO 03-34-31 - 4/4a - Žel. propustek v km 8,761	29 dny	14.09. 21	13.10. 21	EUR
814	***Základy TV + podpěry TV koleje 1, 3***	**49 dny**	**14.09. 21**	**02.11. 21**	
815	SO 03-61-01 - 4/4a - Trakční vedení, ŽST Rad	49 dny	14.09. 21	02.11. 21	EŽ
816	***Svršek + trakce kolejí 1, 3 v úseku smíchovské záhlaví - výhybky 1/4 mimo***	**9 dny**	**05.12. 21**	**14.12. 21**	
817	SO 03-31-01 - 4/4a - Žel. svršek, lichá skupina, ŽST Rad	9 dny	05.12. 21	14.12. 21	GJW
818	SO 03-61-01 - 4/4a - Trakční vedení, ŽST Rad	9 dny	05.12. 21	14.12. 21	EŽ
819	SO 03-67-01 - 4/4a - Ukolenění, ŽST Rad	9 dny	05.12. 21	14.12. 21	EŽ
820	SO 91-31-51 - 4/4a - Výstroj a značení trati, Smí-Če	9 dny	05.12. 21	14.12. 21	STR
821	Uzavírka MK Prvomájová, možný průchod pěších	54 dny	15.12. 21	07.02. 22	
822	Uzavírka podchodu v km 10,221	54 dny	15.12. 21	07.02. 22	
823	zimní + technologická přestávka	54 dny	15.12. 21	07.02. 22	
824	**4/4c - Rekonstrukce liché skupiny (1.část)**	**6 dny**	**08.02. 22**	**14.02. 22**	
825	Uzavírka MK Prvomájová, možný průchod pěších	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	
826	Přechod od výpravní budovy na ostrovní nástupiště 3 po dočasné lávce a hotovou částí podchodu v km 9,764	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	
827	Uzavírka podchodu v km 10,221	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	
828	PS 03-21-02 - 4/4c - SZZ, ŽST Rad	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	EUR/AŽD
829	PS 03-22-01 - 4/4c - MK, ŽST Rad	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	EUR/AŽD
830	PS 03-22-15 - 4/4c - Sdělovací zařízení, ŽST Rad	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	EUR/AŽD
831	PS 03-22-21 - 4/4c - Rozhlasové zařízení, ŽST Rad	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	EUR/AŽD
832	PS 03-22-23 - 4/4c - Kamerový systém, ŽST Rad	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	EUR/AŽD
833	PS 03-22-02 - 4/4c - Úprava DK, ŽST Rad	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	EUR/AŽD
834	PS 03-22-22 - 4/4c - Informační zařízení, ŽST Rad	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	EUR/EL
835	PS 03-22-11 - 4/4c - Telefonní zapojovač, ŽST Rad	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	EUR/AŽD
836	PS 03-22-12 - 4/4c - Úprava ATÚ, ŽST Rad	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	EUR/AŽD
837	PS 03-24-01 - 4/4c - Výtahy I, ŽST Rad	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	EUR
838	PS 91-22-01 - 4/4c - DOK a TK, Smí-Če	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	EUR/AŽD
839	PS 91-22-31 - 4/4c - TRS a MRS, Smí-Če	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	EUR/AŽD
840	SO 03-36-32 - 4/4c - Děšťová kanalizace, ŽST Rad	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	STR
841	SO 03-39-10 - 4/4c - Kabelovod, ŽST Rad	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	EUR
842	SO 03-40-01 - 4/4c - PHS, ulice Ke Zděři I, Rad	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	STR
843	SO 03-40-02 - 4/4c - PHS, ulice Vrážská, Rad	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	STR
844	SO 03-40-52 - 4/4c - PHS, Centrum Radotín	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	STR
845	SO 03-64-01 - 4/4c- Elektrický ohřev výměn, ŽST Rad	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	EUR/EL
846	SO 03-66-01 - 4/4c - Rozvod NN a osvětlení, ŽST Rad	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	EUR/EL
847	SO 02-66-63 - 4/4c - Dálkové ovládání odpojovačů, ŽST Rad	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	EUR/EL
848	***Demolice nástupišť v liché skupině***	**6 dny**	**08.02. 22**	**14.02. 22**	
849	SO 03-32-01 - 4/4c - Nástupiště č.1, ŽST Rad	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	GJW
850	SO 03-32-02 - 4/4c - Nástupiště č.2, ŽST Rad	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	GJW
851	***Demontáž výhybek 1, 2, 4, 6, 8B, 8a, 11, 13, 21, 22, 26, 28, 30***	**6 dny**	**08.02. 22**	**14.02. 22**	
852	SO 03-31-01 - 4/4a - Žel. svršek, lichá skupina, ŽST Rad	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	GJW
853	SO 91-31-51 - 4/4a - Výstroj a značení trati, Smí-Če	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	STR
854	***Rekonstrukce propustku v km 9,050 (část pod spojkou 8 - 11)***	**6 dny**	**08.02. 22**	**14.02. 22**	
855	SO 03-34-32 - 4/4a - Žel. propustek v km 9,050	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	EUR
856	***Výhybky 4X, 5X, 6X, 7X, 8X + napojení od Chuchle 8. únor 2022 - 14. únor 2022 0,2 1,0 7***	**6 dny**	**08.02. 22**	**14.02. 22**	
857	SO 03-31-01 - 4/4a - Žel. svršek, lichá skupina, ŽST Rad	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	GJW
858	SO 91-31-51 - 4/4a - Výstroj a značení trati, Smí-Če	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	STR
859	**4/4d - Rekonstrukce liché skupiny (2.část)**	**93 dny**	**15.02. 22**	**19.05. 22**	
860	Uzavírka MK Prvomájová	79 dny	15.02. 22	05.05. 22	
861	Přechod od výpravní budovy na ostrovní nástupiště 3 po dočasné lávce a hotovou částí podchodu v km 9,764	74 dny	15.02. 22	30.04. 22	
862	Uzavírka Vrážské ulice (úsek U Jankovky - Matějovského), 8 hodin noc	0 dny	19.05. 22	19.05. 22	
863	**Definitivní uzavření přejezdu v ulici Na betonce**	**0 dny**	06.05. 22	06.05. 22	
864	Uzavírka podchodu v km 10,221	74 dny	15.02. 22	30.04. 22	
865	PS 03-21-02 - 4/4d - SZZ, ŽST Rad	93 dny	15.02. 22	19.05. 22	EUR/AŽD
866	PS 03-22-01 - 4/4d - MK, ŽST Rad	93 dny	15.02. 22	19.05. 22	EUR/AŽD
867	PS 03-22-15 - 4/4d - Sdělovací zařízení, ŽST Rad	93 dny	15.02. 22	19.05. 22	EUR/AŽD
868	PS 03-22-21 - 4/4d - Rozhlasové zařízení, ŽST Rad	93 dny	15.02. 22	19.05. 22	EUR/AŽD
869	PS 03-22-23 - 4/4d - Kamerový systém, ŽST Rad	93 dny	15.02. 22	19.05. 22	EUR/AŽD
870	PS 03-22-02 - 4/4d - Úprava DK, ŽST Rad	93 dny	15.02. 22	19.05. 22	EUR/AŽD
871	PS 03-22-22 - 4/4d - Informační zařízení, ŽST Rad	93 dny	15.02. 22	19.05. 22	EUR/EL
872	PS 03-22-11 - 4/4d - Telefonní zapojovač, ŽST Rad	93 dny	15.02. 22	19.05. 22	EUR/AŽD
873	PS 03-22-12 - 4/4d - Úprava ATÚ, ŽST Rad	93 dny	15.02. 22	19.05. 22	EUR/AŽD
874	PS 03-24-01 - 4/4d - Výtahy I, ŽST Rad	93 dny	15.02. 22	19.05. 22	EUR
875	PS 91-22-01 - 4/4d - DOK a TK, Smí-Če	93 dny	15.02. 22	19.05. 22	EUR/AŽD
876	PS 91-22-31 - 4/4d - TRS a MRS, Smí-Če	93 dny	15.02. 22	19.05. 22	EUR/AŽD
877	SO 03-31-11 - 4/4d - Žel. spodek, lichá skupina, ŽST Rad	74 dny	15.02. 22	30.04. 22	STR/GJW
878	SO 03-35-05 - 4/4d - Úprava VO v km 10,046	87 dny	15.02. 22	13.05. 22	EUR/EL
879	SO 62-35-01 - 4/4d - Úprava rozvodu NN 0,4kV PREDi, PPO Rad	79 dny	15.02. 22	05.05. 22	EUR/EL
880	SO 62-35-02 - 4/4d - Úprava VO, PPO Rad	79 dny	15.02. 22	05.05. 22	EUR/EL
881	SO 62-35-21 - 4/4d - Úprava sdělovaccích rozvodů, PPO STAHL	79 dny	15.02. 22	05.05. 22	EUR/EL
882	SO 62-35-61 - 4/4d - PPO č. 323-325, ulice Vrážská	79 dny	15.02. 22	05.05. 22	STR
883	SO 03-36-31 - 4/4d - Děšťová kanalizace v km 9,393	79 dny	15.02. 22	05.05. 22	STR
884	SO 03-36-32 - 4/4d - Děšťová kanalizace, ŽST Rad	93 dny	15.02. 22	19.05. 22	STR
885	SO 03-38-02 - 4/4d - Úprava komunikace pod mostem v km 9,393	79 dny	15.02. 22	05.05. 22	STR
886	SO 03-38-21 - 4/4d - Zpevněné plochy, ŽST Rad	93 dny	15.02. 22	19.05. 22	STR
887	SO 03-38-22 - 4/4d - Úprava komunikace u podchodu v km 10,221	93 dny	15.02. 22	19.05. 22	STR
888	SO 03-38-23 - 4/4d - Zpevněné plochy HMP, ŽST Rad	12 dny	07.05. 22	19.05. 22	STR
889	SO 03-38-91 - 4/4d - Úprava dopravního značení, Rad	12 dny	07.05. 22	19.05. 22	STR
890	SO 03-39-10 - 4/4d - Kabelovod, ŽST Rad	93 dny	15.02. 22	19.05. 22	EUR
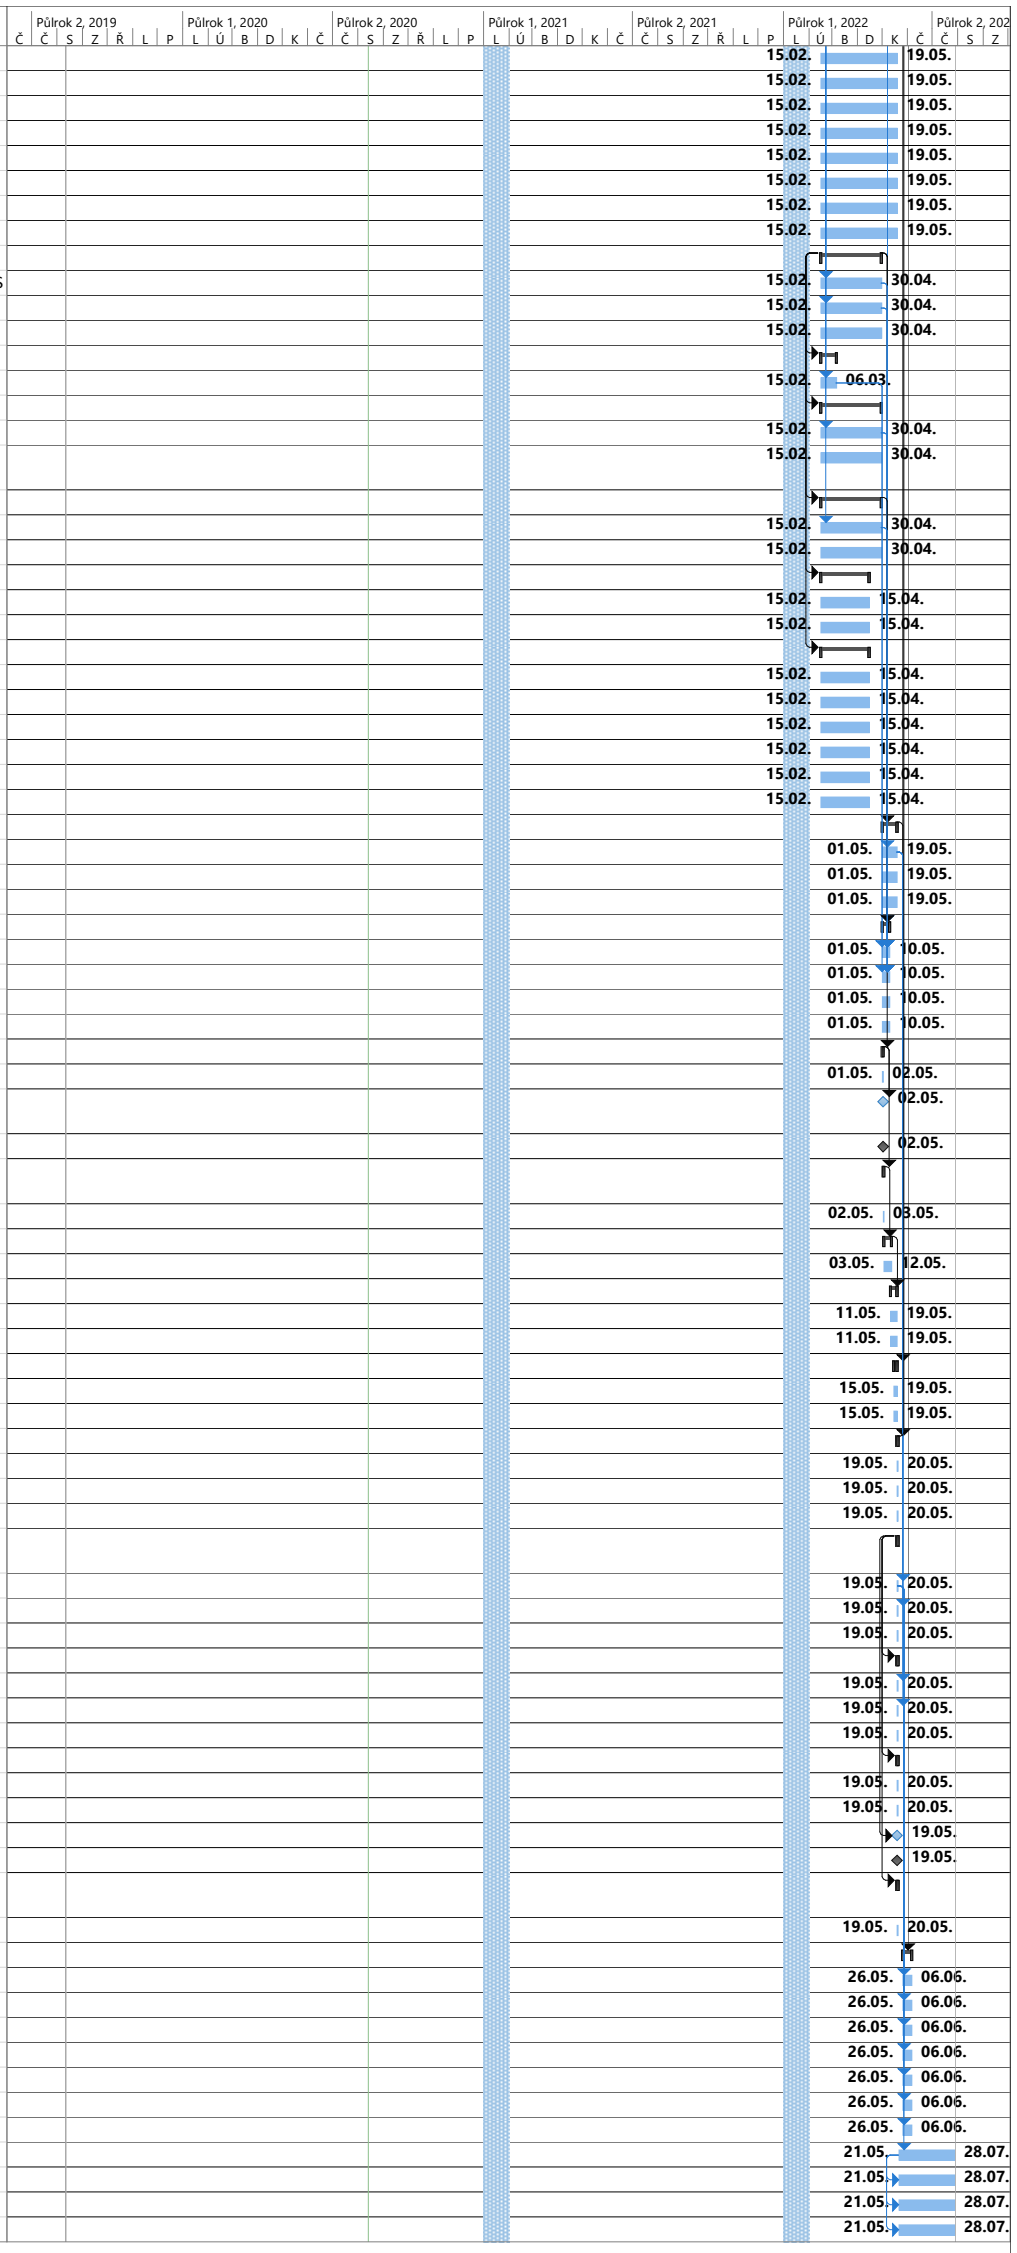
ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Zhotovitel
891	SO 03-40-01 - 4/4d - PHS, ulice Ke Zděři I, Rad	93 dny	15.02. 22	19.05. 22	STR
892	SO 03-40-02 - 4/4d - PHS, ulice Vrážská, Rad	93 dny	15.02. 22	19.05. 22	STR
893	SO 03-40-52 - 4/4d - PHS, Centrum Radotín	93 dny	15.02. 22	19.05. 22	STR
894	SO 03-64-01 - 4/4d- Elektrický ohřev výměn, ŽST Rad	93 dny	15.02. 22	19.05. 22	EUR/EL
895	SO 03-66-01 - 4/4d - Rozvod NN a osvětlení, ŽST Rad	93 dny	15.02. 22	19.05. 22	EUR/EL
896	SO 02-66-63 - 4/4d - Dálkové ovládání odpojovačů, ŽST Rad	93 dny	15.02. 22	19.05. 22	EUR/EL
897	SO 62-38-21 - 4/4d - Chodník v ulici Vrážská, PPO	93 dny	15.02. 22	19.05. 22	STR
898	SO 91-61-51 - 4/4d - Převěšení závěsného optického kabelu SŽDC, Smí-Če	93 dny	15.02. 22	19.05. 22	EŽ
899	***Rekonstrukce mostů v km 9,393 + 9,764 (lichá část)***	**74 dny**	**15.02. 22**	**30.04. 22**	
900	SO 03-34-01 - 4/4d - Žel. most v km 9,393	74 dny	15.02. 22	30.04. 22	EUR/MTS
901	SO 03-34-21 - 4/4d - Žel. podchod v km 9,764, ŽST Rad	74 dny	15.02. 22	30.04. 22	EUR
902	SO 03-52-04 - 4/4d - Zastřešení výstupu před nádraží, ŽST Rad	74 dny	15.02. 22	30.04. 22	STR
903	***Rekonstrukce propustku v km 9,050 (část pod kolejí 3)***	**19 dny**	**15.02. 22**	**06.03. 22**	
904	SO 03-34-32 - 4/4d - Žel. propustek v km 9,050	19 dny	15.02. 22	06.03. 22	EUR
905	***Most v km 9,950 (lichá část)***	**74 dny**	**15.02. 22**	**30.04. 22**	
906	SO 03-34-22 - 4/4d - Žel. podchod v km 9,950, ŽST Rad	74 dny	15.02. 22	30.04. 22	STR
907	SO 03-52-06 - 4/4d - Zastřešení výstupu z podchodu k ulici Vrážská, ŽST Rad	74 dny	15.02. 22	30.04. 22	STR
908	***Podchod v km 10,221 (část pod kolejemi 1, 2)***	**74 dny**	**15.02. 22**	**30.04. 22**	
909	SO 03-34-23 - 4/4d - Žel. podchod v km 10,221, ŽST Rad	74 dny	15.02. 22	30.04. 22	STR/MTS
910	SO 03-36-34 - 4/4d - Úprava přípojky odvodnění v km 10,221	74 dny	15.02. 22	30.04. 22	STR
911	***Základy TV + podpěry TV lichá skupina***	**59 dny**	**15.02. 22**	**15.04. 22**	
912	SO 03-61-01 - 4/4d - Trakční vedení, ŽST Rad	59 dny	15.02. 22	15.04. 22	EŽ
913	SO 03-61-02 - 4/4d - Netypové brány trakčního vedení, ŽST Rad	59 dny	15.02. 22	15.04. 22	EŽ
914	***Nástupiště v liché skupině včetně zastřešení***	**59 dny**	**15.02. 22**	**15.04. 22**	
915	SO 03-32-01 - 4/4d - Nástupiště č.1, ŽST Rad	59 dny	15.02. 22	15.04. 22	GJW
916	SO 03-32-02 - 4/4d - Nástupiště č.2, ŽST Rad	59 dny	15.02. 22	15.04. 22	GJW
917	SO 03-52-01 - 4/4d - Zastřešení nástupiště č.2, ŽST Rad	59 dny	15.02. 22	15.04. 22	STR
918	SO 03-54-01 - 4/4d - Orientační systém, ŽST Rad	59 dny	15.02. 22	15.04. 22	STR
919	SO 03-54-02 - 4/4d - Orientační systém, ŽST Rad	59 dny	15.02. 22	15.04. 22	STR
920	SO 03-60-01 - 4/4d - Drobná architektura, ŽST Rad	59 dny	15.02. 22	15.04. 22	STR
921	***Svršek liché kolejové skupiny (výhybky 10X, 15X, 18X, 25X, 26X)***	**18 dny**	**01.05. 22**	**19.05. 22**	
922	SO 03-31-01 - 4/4d - Žel. svršek, lichá skupina, ŽST Rad	18 dny	01.05. 22	19.05. 22	GJW
923	SO 03-67-01 - 4/4d - Ukolenění, ŽST Rad	18 dny	01.05. 22	19.05. 22	EŽ
924	SO 91-31-51 - 4/4d - Výstroj a značení trati, Smí-Če	18 dny	01.05. 22	19.05. 22	STR
925	***Spodek + svršek výhybky 28X***	**9 dny**	**01.05. 22**	**10.05. 22**	
926	SO 03-31-02 - 4/4d - Žel. svršek, sudá skupina, ŽST Rad	9 dny	01.05. 22	10.05. 22	STR
927	SO 03-31-12 - 4/4d - Žel. spodek, sudá skupina, ŽST Rad	9 dny	01.05. 22	10.05. 22	STR
928	SO 03-67-01 - 4/4d - Ukolenění, ŽST Rad	9 dny	01.05. 22	10.05. 22	EŽ
929	SO 91-31-51 - 4/4d - Výstroj a značení trati, Smí-Če	9 dny	01.05. 22	10.05. 22	STR
930	***Dočasná lávka pro pěší přes kolejiště žst.: odstrojení nosných konstrukcí***	**1 den**	**01.05. 22**	**02.05. 22**	
931	SO 03-34-21.2 - 4/4d - Provizorní lávka, ŽST Rad	1 den	01.05. 22	02.05. 22	STR/MTS
932	***Dočasná lávka pro pěší přes kolejiště žst.: demontáž nosné konstrukce z podpěrných věží***	**0 dny**	**02.05. 22**	**02.05. 22**	
933	SO 03-34-21.2 - 4/4d - Provizorní lávka, ŽST Rad	0 dny	02.05. 22	02.05. 22	STR/MTS
934	***Dočasná lávka pro pěší přes kolejiště žst.: demontáž schodišťových a podpěrných věží***	**1 den**	**02.05. 22**	**03.05. 22**	
935	SO 03-34-21.2 - 4/4d - Provizorní lávka, ŽST Rad	1 den	02.05. 22	03.05. 22	STR/MTS
936	***Dočasná lávka pro pěší přes kolejiště žst.: rozebrání nosných konstrukcí***	**9 dny**	**03.05. 22**	**12.05. 22**	
937	SO 03-34-21.2 - 4/4d - Provizorní lávka, ŽST Rad	9 dny	03.05. 22	12.05. 22	STR/MTS
938	***Definitivní provedení koleje 4c (po odstranění dočasné lávky)***	**8 dny**	**11.05. 22**	**19.05. 22**	
939	SO 03-31-02 - 4/4d - Žel. svršek, sudá skupina, ŽST Rad	8 dny	11.05. 22	19.05. 22	STR
940	SO 03-31-12 - 4/4d - Žel. spodek, sudá skupina, ŽST Rad	8 dny	11.05. 22	19.05. 22	STR
941	***TV liché skupiny (výhybka 8X včetně spojky 8X - 11X)***	**4 dny**	**15.05. 22**	**19.05. 22**	
942	SO 03-61-01 - 4/4d - Trakční vedení, ŽST Rad	4 dny	15.05. 22	19.05. 22	EŽ
943	SO 03-67-01 - 4/4d - Ukolenění, ŽST Rad	4 dny	15.05. 22	19.05. 22	EŽ
944	**4/4e - Rekonstrukce sudé skupiny (3.část)**	**1 den**	**19.05. 22**	**20.05. 22**	
945	PS 03-21-02 - 4/4e - SZZ, ŽST Rad	1 den	19.05. 22	20.05. 22	EUR/AŽD
946	PS 03-22-01 - 4/4e - MK, ŽST Rad	1 den	19.05. 22	20.05. 22	EUR/AŽD
947	PS 03-22-15 - 4/4e - Sdělovací zařízení, ŽST Rad	1 den	19.05. 22	20.05. 22	EUR/AŽD
948	***Definitivní kolej 2 mezi výhybkami 28X a 29X, náhrada dočasné výhybky 33P kolejovým polem***	**1 den**	**19.05. 22**	**20.05. 22**	
949	SO 03-31-02 - 4/4e - Žel. svršek, sudá skupina, ŽST Rad	1 den	19.05. 22	20.05. 22	STR
950	SO 03-31-12 - 4/4e - Žel. spodek, sudá skupina, ŽST Rad	1 den	19.05. 22	20.05. 22	STR
951	SO 91-31-51 - 4/4e - Výstroj a značení trati, Smí-Če	1 den	19.05. 22	20.05. 22	STR
952	***Definitivní provedení koleje 4c (po odstranění dočasné lávky)***	**1 den**	**19.05. 22**	**20.05. 22**	
953	SO 03-31-02 - 4/4e - Žel. svršek, sudá skupina, ŽST Rad	1 den	19.05. 22	20.05. 22	STR
954	SO 03-31-12 - 4/4e - Žel. spodek, sudá skupina, ŽST Rad	1 den	19.05. 22	20.05. 22	STR
955	SO 91-31-51 - 4/4e - Výstroj a značení trati, Smí-Če	1 den	19.05. 22	20.05. 22	STR
956	***Definitivní TV sudé skupiny***	**1 den**	**19.05. 22**	**20.05. 22**	
957	SO 03-61-01 - 4/4e - Trakční vedení, ŽST Rad	1 den	19.05. 22	20.05. 22	EŽ
958	SO 03-67-01 - 4/4e - Ukolenění, ŽST Rad	1 den	19.05. 22	20.05. 22	EŽ
959	***Demolice dočasného nástupiště u koleje 8***	**0 dny**	**19.05. 22**	**19.05. 22**	
960	SO 03-32-03 - 4/4e - Nástupiště č.3, ŽST Rad	0 dny	19.05. 22	19.05. 22	STR
961	***Dokončení povrchu ostrovního nástupiště 3 (prostor po demontované podpěrné věži dočasné lávky)***	**1 den**	**19.05. 22**	**20.05. 22**	
962	SO 03-32-03 - 4/4e - Nástupiště č.3, ŽST Rad	1 den	19.05. 22	20.05. 22	STR
963	**Aktivace definitivního zabezpečovacího zařízení**	**11 dny**	**26.05. 22**	**06.06. 22**	
964	PS 02-21-01 - SZZ, VCH	11 dny	26.05. 22	06.06. 22	STR/AŽD
965	PS 03-21-01 - ZZ, vlečka cementárna	11 dny	26.05. 22	06.06. 22	STR/AŽD
966	PS 03-21-02 - SZZ, ŽST Rad	11 dny	26.05. 22	06.06. 22	EUR/AŽD
967	PS 02-21-11 - TZZ, Smí-VCH	11 dny	26.05. 22	06.06. 22	STR/AŽD
968	PS 02-21-12- TZZ, Krč-VCH	11 dny	26.05. 22	06.06. 22	STR/AŽD
969	PS 02-21-13 - TZZ, VCH-Rad	11 dny	26.05. 22	06.06. 22	STR/AŽD
970	PS 04-21-14 - TZZ Rad-Če	11 dny	26.05. 22	06.06. 22	STR/AŽD
971	**Úklid staveniště, likvidace ZS**	68 dny	21.05. 22	28.07. 22	
972	SO 91-71-02 - Náhradní výsadba, Smí-Če	68 dny	21.05. 22	28.07. 22	EUR
973	SO 91-71-03 - Rekultivace, Smí-Če	68 dny	21.05. 22	28.07. 22	EUR
974	SO 98-98 - Všeobecný objekt	68 dny	21.05. 22	28.07. 22	EUR
